



ANT.: - Oficio 181 DIPUTADO DON COSME MELLADO PINO. COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

MAT.: Informa lo que indica

DE: JORGE DAZA LOBOS
MINISTRO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES (S).

A: JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
PROSECRETARIO SUBROGANTE
CÁMARA DE DIPUTADOS

En atención a su requerimiento señalado en el ANT., informo a usted el estado de las 3 nuevas plantas de revisión técnica que actualmente se encuentran en construcción en la Región de Ñuble.

1.- Planta TÜV Rheinland Chillán, ubicada en el acceso norte de la ciudad, esta planta ha logrado obtener toda la documentación necesaria por parte de la municipalidad para iniciar su operación pese a no estar 100% terminada, para las obras pendientes la empresa entregó una boleta de garantía a la municipalidad considerando la urgencia de su puesta en marcha, en este momento están subsanando problemas internos con el software de los equipos, proceso que escapa totalmente del control del ministerio, sin embargo, la empresa asegura que en un plazo máximo de una semana estarían con los problemas subsanados.

2.- Planta Dekra Chillán, ubicada camino a Huape, esta planta se encuentra prácticamente terminada en lo que ha construcción se refiere, ellos han tenido desde hace tiempo problemas con los canalistas del canal de la luz, con los que esta semana lograron llegar a un acuerdo, con esto se procederá a la construcción de las obras de entrada a la planta y también darán inicio a los trámites legales para su puesta en marcha

3.- Planta TÜV Rheinland Yungay, la planta se encuentra en construcción, también en una etapa bastante avanzada, en este momento se está a la espera de poder realizar la instalación eléctrica.

4.- Planta Dekra Quirihue, esta planta se encuentra en operación desde febrero del presente año. Se adjuntan informes de las empresas con respecto a la planta de Yungay y la planta Dekra de Chillán Cabe mencionar que desde que la empresa Prestotec informó del cierre de su planta en avenida O'Higgins, desde esta Secretaría Regional Ministerial, se inició un proceso de acompañamiento a ambas empresas, dándoles a entender el sentido de urgencia que tiene la apertura de las plantas con el fin de poder agilizar sus procesos, lo que ha permitido que los plazos de apertura sean considerablemente menores a los que estaban originalmente pronosticados.

Saluda atentamente



Distribución:

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA PROSECRETARIO SUBROGANTE CÁMARA DE DIPUTADOS
GABINETE MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
SUBTRANS – OFICINA DE PARTES
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL ÑUBLE - OFICINA DE PARTES



Para verificar la validez de este documento debe escanear el código QR y descargar una copia del documento desde el Sistema de Gestión Documental.

798772

E67029/2023

ABRIL,2023


Estimados Señores/as
Secretaría Regional Ministerial de Transportes de la Región de Ñuble
Subsecretaría de Transportes
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Mediante la presente, Junto con saludar, envío Informe Estado de Avances correspondiente a los recintos adjudicados por la concesionaria DEKRA Revisión Técnica SpA. en la Región de Ñuble.

CONCESIÓN	CÓDIGO	CLASE	COMUNA	DIRECCIÓN
1	AB1601	1 Clase AB	Chillán	Camino a Huape N° 2431
	AB1602		Quirihue	Camino a Cobquecura KM 1.4

Sin otro particular,

Se despide atentamente



Alexis Mignogna Arce
DEKRA Revisión Técnica

PRT CHILLAN AB1601

1) ANTECEDENTES.

- Actualmente se está conversando con los canalistas sobre la aprobación del proyecto Serviu, de esta forma solicitar la recepción de obra parcial para posteriormente solicitar la patente provisoria a la municipalidad. Serviu tiene el proyecto visado, pero necesita la autorización de la asociación Cato Ñuble para entregar la autorización, este es el punto más crítico del proyecto.
- El 19 de abril fue solicitada la recepción de municipal, la municipalidad está asignado el revisor del proyecto.
- La planta está operativa con las 4 líneas funcionando.
- El personal esta reclutado, pero no ha sido contratado hasta tener claridad de la aprobación de la aprobación del proyecto Serviu y permisos municipales.

1- Cronograma.

El siguiente cronograma informará los siguientes hitos:

- Hitos Finalizados.
- Hitos En Progreso.
- Hitos Pendientes.

2.1.- Hitos Finalizados.

HITOS FINALIZADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE	ESTADO
1) Resolución Publicación Diario Oficial	21-11-20	21-11-20	100%	FINALIZADO
2) Escrituras Terrenos	21-11-20	30-11-20	100%	FINALIZADO
3) Proyectos	01-12-20	09-01-21	100%	FINALIZADO
3.1)Topografía	01-12-20	20-12-20	100%	FINALIZADO
4) Licitación construcción	25-12-20	18-02-21	100%	FINALIZADO
4.1) Entrega antecedentes	25-12-20	25-12-20	100%	FINALIZADO
4.2) Estudio Proyectos	26-12-20	24-01-21	100%	FINALIZADO
4.3) Entrega Presupuesto	25-01-21	25-01-21	100%	FINALIZADO

4.4) Estudio	25-01-21	08-02-21	100%	FINALIZADO
4.5) Adjudicación	09-02-21	18-02-21	100%	FINALIZADO
5.1.1) Estudio	18-09-20	27-09-20	100%	FINALIZADO
5.1.2) Ingreso Seremitt	28-09-20	28-09-20	100%	FINALIZADO
5.1.4) Observaciones Seremitt	13-10-20	13-10-20	100%	FINALIZADO
5.2) Clasificación Inofensiva	07-04-21	22-05-21	100%	FINALIZADO
5.3.1) Antecedentes PE	13-11-20	23-11-20	100%	FINALIZADO
5.3.2) Ingreso	24-11-20	24-11-20	100%	FINALIZADO
5.3.3) Revisión Municipal	24-11-20	01-02-21	100%	FINALIZADO
5.4) Permiso de obras preliminares	04-03-21	08-04-21	100%	FINALIZADO
7.1) Ingreso Serviu	18-12-20	18-12-20	100%	FINALIZADO
7.2) Ingreso 2da Tramitación	10-02-21	10-02-21	100%	FINALIZADO
8) CORONAVIRUS – Cuarentena	29-03-21	09-04-21	100%	FINALIZADO
8.1) Inicio Cuarentena - Permiso ante CCHC	29-03-21	29-03-21	100%	FINALIZADO
8.2) Tramitación según Ministerio	01-04-21	08-04-21	100%	FINALIZADO
8.3) Otorgamiento Permiso (Fecha estimada)	09-04-21	09-04-21	100%	FINALIZADO
8.4) Ingreso Maquinarias y Persona	09-04-21	15-04-21	100%	FINALIZADO
8.5) Otorgamiento Permiso (Fecha estimada)	16-04-21	16-04-21	100%	FINALIZADO
9.1) Instalación y construcciones provisionarias	16-04-21	29-04-21	100%	FINALIZADO
9.1.1) Instalación de faenas	16-04-21	29-04-21	100%	FINALIZADO
9.2.1) Trazado de obra	19-04-21	28-04-21	100%	FINALIZADO
9.2.2) Excavaciones y Rellenos	03-03-21	02-05-21	100%	FINALIZADO
12.1) Orden de Compra	14-01-21	14-01-21	100%	FINALIZADO
5.3) PERMISO EDIFICACION	13-11-20	20-07-21	100%	FINALIZADO
5.1) Análisis Vial Básico	01-12-20	11-07-21	100%	FINALIZADO
9.6) Zona de revisión – Estación de ruidos	07-05-21	15-09-21	100%	FINALIZADO
9.6.1) Obra gruesa	30-04-21	24-09-21	100%	FINALIZADO
12) Recepción de equipos	14-01-21	24-07-21	100%	FINALIZADO
9.2) Obras Generales	03-03-21	07-07-22	100%	FINALIZADO
9.2.3) Red de evacuación de aguas lluvias	05-06-21	07-07-22	100%	FINALIZADO
9.3) Instalaciones generales	19-04-21	03-09-22	100%	FINALIZADO
9.4.) Edificio de oficinas	23-05-21	27-08-22	100%	FINALIZADO
9.4.1) Obra Gruesa	23-05-21	14-08-22	100%	FINALIZADO
9.5) Edificio de revisión (Lineas)	23-03-21	13-10-22	100%	FINALIZADO
9.5.1) Obra gruesa	09-04-21	13-10-22	100%	FINALIZADO
9.7) Exteriores (zona pre y post revisión)	30-05-21	31-08-22	100%	FINALIZADO
9.7.1) Obra gruesa	30-05-21	31-08-22	100%	FINALIZADO

16.1.1) Factibilidad eléctrico TE1	22-10-22	30-02-23	100%	FINALIZADO
6.1) Demarcación y Señalética	11-06-21	30-04-23	100%	FINALIZADO
9.6.2) Pinturas	15-08-21	04-03-23	100%	FINALIZADO
16.1.3) Certificado de Dotación de Aguas	16-11-22	20-04-23	100%	FINALIZADO
13.8) Pruebas con Vehículo	22-04-23	05-05-23	100%	FINALIZADO
10) Cartelería Y Demarcación	29-07-22	05-03-23	100%	FINALIZADO

2.2.- Hitos en Progreso

HITOS EN PROGRESO	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE	ESTADO
5) PERMISOS	13-12-22	14-04-23	98%	EN PROGRESO
7) Accesos SERVIU	18-12-22	24-04-23	90%	EN PROGRESO
6) OBRAS DE MITIGACIONES	22-03-23	03-05-23	50%	EN PROGRESO
14.1) Patente provisoria	22-03-23	10-04-23	20%	EN PROGRESO

2.3.- Hitos Pendientes.

HITOS PENDIENTES	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE	ESTADO
13) Puesta en marcha	05-07-23	31-05-2023	0%	PENDIENTE
13.3) Contratación Personal	05-03-23	15-05-2023	0%	PENDIENTE
13.4) Formación Personal	15-05-23	29-05-2023	0%	PENDIENTE
13.5) Solicitud Marcha Blanca MTT	15-05-23	15-05-23	0%	PENDIENTE
13.6) Inspección MTT	10-05-23	11-05-2023	0%	PENDIENTE
13.9) Marcha Blanca	17-05-23	22-05-2023	0%	PENDIENTE
14) Patentes comerciales	19-05-23	15-12-2023	0%	PENDIENTE
15) INICIO OPERACIONES	31-05-23	31-05-23	0%	PENDIENTE
16) RECEPCION FINAL			0%	PENDIENTE

3.Documentos de respaldo


3.1 Fotografías



Casetas y cartelería de demarcación



Línea de livianos y dinamómetro

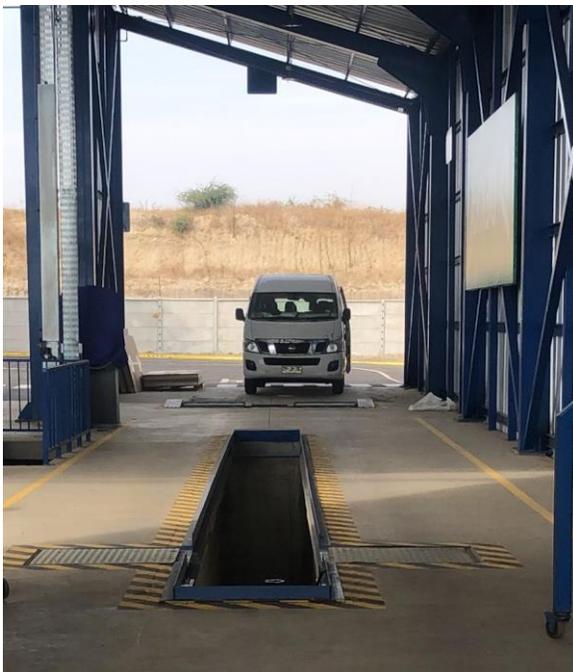

Pruebas con vehículos



Interior oficinas





Accesos

REF.: LICITACIÓN PARA OPERAR PLANTAS DE
REVISIÓN TÉCNICA REGIÓN DE ÑUBLE.

Yungay, 28 de abril de 2023

INFORME DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN PRT YUNGAY

A continuación, se detalla el avance mensual de la PRT Yungay **correspondiente al mes de ABRIL**, según lo indicado en el Procedimiento de Implementación de Plantas de Revisión Técnica.

1 Proyectos e Informes	Porcentaje de Avance
1.1 Topografía	100%
1.2 Proyecto de Arquitectura	100%
1.3 Mecánica de Suelos	100%
1.4 Proyecto de Cálculo Estructural	100%
1.5 Instalaciones Eléctricas y de Corrientes Débiles	100%
1.6 Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado	100%
1.7 Instalaciones de Climatización	100%
1.8 Proyecto de Pavimentación y Aguas Lluvias	100%
1.9 Proyecto de Seguridad	100%
1.10 Proyecto de Circuito Cerrado de Televisión	100%
1.11 Informe Vial Básico	100%
1.12 Tramitaciones Municipales y otros (Permiso de Edificación y Certificados)	100%
2 Licitación	100%

3 Construcción e Implementación	
3.1 Construcción Edificio Administrativo	100%
3.2 Construcción de Galpón y Sonómetro	100%
3.3 Pavimentación interior	100%
3.4 Instalación de Equipamientos Técnicos	50%
3.5 Aprobación Proyecto IVB	66%
3.6 Aprobación Proyecto Accesos	0%
3.7 Aprobación Proyecto Vialidad	0%
3.8 Patente municipal (provisoria)	0%
3.9 Autorización de funcionamiento (proy. Sanitario)	50%
3.10 Recepción final de obra DOM	0%
3.11 Aprobación Obras Accesos SERVIU	0%
3.12 Aprobación Obras Vialidad y Mitigación (y/o garantía)	0%
4 Marcha blanca	
4.1 Presentación a SEREMITT	0%
4.2 Proceso de Marcha blanca	0%
4.3 Resolución puesta en marcha	0%
5 Atención a público	0%



VALPARAÍSO, 27 de abril de 2023
OFICIO N°181

La **COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES**, acordó dirigir oficio, a US., para que informe sobre el estado de la licitación de la planta de revisión técnica en la localidad de campanario, comuna de Yungay, la cual se pondría en marcha en el año 2021, lo cual no ha ocurrido, y conocer las razones de dicha situación. Asimismo, informe el estado de las licitaciones y puesta en marcha de todas las plantas de revisión técnica que se planea tener en la región de Ñuble.

Lo que tengo a honra poner en conocimiento de US., por orden del señor Presidente de la Comisión, **H. DIPUTADO DON COSME MELLADO PINO**.

Dios guarde a US.,

ROBERTO FUENTES INNOCENTI
Secretario de la Comisión

**AL SEÑOR MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES,
DON JUAN CARLOS MUÑOZ ABOGABIR.**

.-SEREMI DE TRANSPORTES DE LA REGIÓN DE ÑUBLE.



Firmado electrónicamente

<https://extranet.camara.cl/verificardoc>

Código de verificación: F3A4836AF26653C1

Firmado por Roberto Mario Fuentes
Innocenti
Fecha 27/04/2023 17:36:39 CLT
