



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO
SOBRE LOS RECURSOS INVERTIDOS
EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRA-
TAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS
Y ASIMILABLES -CHAQUETA BLANCA",
ID N° 2430-55-LP14, Y DEL CONTRATO
"SERVICIO DE MANTENCIÓN Y
OPERACIÓN VERTEDERO MUNICIPAL
-LA CHIMBA", ID N° 2430-54-LQ17,
AMBOS DE LA MUNICIPALIDAD DE
ANTOFAGASTA.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGIÓN 130

26 DIC 2019

N° 33.086

SANTIAGO,




21302019122633086

El presente documento fue elaborado con el objeto de exponer los recursos invertidos por diferentes organismos del Estado, para llevar a cabo la labor de acopio y tratamiento de los residuos domiciliarios y asimilables de la comuna de Antofagasta, para el periodo comprendido entre los años 2013 y 2019.

En razón de ello, se efectuó un análisis para determinar si en el desarrollo del proyecto denominado "Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables-Chaqueta Blanca", ID N° 2430-55-LP14, ejecutado por la Municipalidad de Antofagasta como unidad técnica, se cumplió con los principios de eficiencia, eficacia y economicidad que contempla el ordenamiento jurídico. Lo anterior, teniendo en consideración que en forma paralela estaba en ejecución el contrato "Servicio de Mantenimiento y Operación Vertedero Municipal-La Chimba", ID N° 2430-54-LQ17.

Para efectos de exponer los montos gastados en ambas operaciones, provenientes de diferentes reparticiones públicas, se tomó como punto de inicio el año 2013, pues representa el periodo en que se compró el terreno para el proyecto "Chaqueta Blanca" y se analizaron los distintos estados de pago asociados a los mentados contratos a diciembre de 2019.

AL SEÑOR
CARLOS CÁMARA OYARZO
ABOGADO SECRETARIO DE LA COMISIÓN (CEI 33)
CONGRESO NACIONAL
VALPARAÍSO



DISTRIBUCIÓN:

- Diputado señor José Miguel Castro Bascuñán, Congreso Nacional, Valparaíso.
- Contraloría Regional de Antofagasta.
- Unidad Técnica de Control Externo de la Contraloría Regional de Antofagasta.
- Comité de Presentaciones Parlamentarias de la Contraloría General de la República.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA

En este contexto, del análisis realizado se determinó lo que se expone a continuación:

- Vertedero Municipal "La Chimba"

Como cuestión previa, cabe señalar que mediante la resolución exenta N° 1.942, de 2009, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta -SEREMI- autorizó un plan de adecuación que contemplaba, en lo que importa, el mejoramiento del Vertedero Municipal "La Chimba" y un plan de cierre y abandono del mismo. Dicho programa estableció que el citado recinto podría seguir operando si adoptaba las medidas necesarias para terminar con la presencia de personas ajenas a su operación, impedir la proliferación de vectores de interés sanitario y cubrir a diario los residuos dispuestos en ese sitio, entre otros requerimientos.

Luego, a través de la resolución exenta N° 2.122, de 9 de abril de 2015, el citado organismo de salud resolvió el cierre del nombrado vertedero en el plazo de seis (6) meses, en virtud de la existencia de diversos procesos sumariales en contra de la Municipalidad de Antofagasta por incumplimientos a la normativa sanitaria y de las exigencias realizadas por dicha SEREMI en actas de fiscalización previas.

Ahora bien, en relación a los costos asociados al servicio de operación del aludido vertedero, este Organismo de Control efectuó una revisión a los pagos realizados por dicho municipio desde enero de 2013 -que como se indicó, corresponde a la época de la compra del terreno donde se emplaza "Chaqueta Blanca"- a diciembre de 2019, constatándose que durante ese periodo el servicio ha sido ejecutado por cuatro (4) empresas diferentes.

Sobre el particular, es dable anotar que la empresa Ingeniería Qumiranka SpA., fue la última sociedad encargada de dicha prestación, desde noviembre de 2017, según consta en el decreto alcaldicio N° 1.579, de 20 de noviembre de esa anualidad, que aprueba el contrato respectivo.

En dicho pacto, se acordó el pago por la mantención del vertedero, por un costo total de \$ 106.992.562 mensuales, -correspondiente a \$ 41.492.562, por costo fijo y por un costo variable máximo de \$ 65.500.000, impuestos incluidos en ambos montos- esto es, por el tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios y asimilables, así como de los escombros que se depositan en el lugar, además de la ejecución de trabajos de eliminación de basurales en un radio de 2 KM del perímetro del recinto, sin estipular un cobro adicional por tonelada de basura recibida.

Seguidamente, es del caso puntualizar que el contrato con la nombrada empresa finalizó el 3 de noviembre de 2019, advirtiéndose la implementación de un trato directo¹ con la misma organización,

¹ El decreto alcaldicio que aprueba el trato directo que se indica, no fue emitido oportunamente por la entidad edilicia, por lo cual la empresa Ingeniería Qumiranka SpA dedujo un recurso de protección ante la Corte de



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA


por cuarenta y cinco (45) días corridos, desde el 4 de noviembre hasta el 19 de diciembre de 2019, dado que se consideró que ese sería el tiempo que el municipio se demoraría en tramitar otra licitación pública para la administración del recinto por una nueva anualidad.

El trato directo en comento, estableció un valor de costo fijo según lo establece el apartado quinto del contrato suscrito entre las partes, de \$ 41.492.562, IVA incluido, y un costo variable definido en tabla 4.1 de la misma convención, de acuerdo con el uso de maquinarias y equipos.

En este contexto, y considerando lo convenido con cada una de las cuatro (4) empresas que prestaron el servicio de operación de "La Chimba", este Organismo de Control verificó que la Municipalidad de Antofagasta desembolsó un monto total de \$ 7.308.797.420 entre enero de 2013 a octubre de 2019, según consta en los estados de pago tenidos a la vista, mientras que respecto de los meses de noviembre y diciembre del año 2019, se estima erogará, la suma de \$113.217.032², por la mantención del referido vertedero. Totalizando así, un costo de \$7.422.014.452.

El resumen del monto descrito, se muestra en la siguiente tabla, mientras que el detalle de su composición, se expone en el anexo N° 1, de este documento:

Tabla N° 1: Resumen de costos del vertedero "La Chimba" por prestador del servicio, período 2013 a 2019.

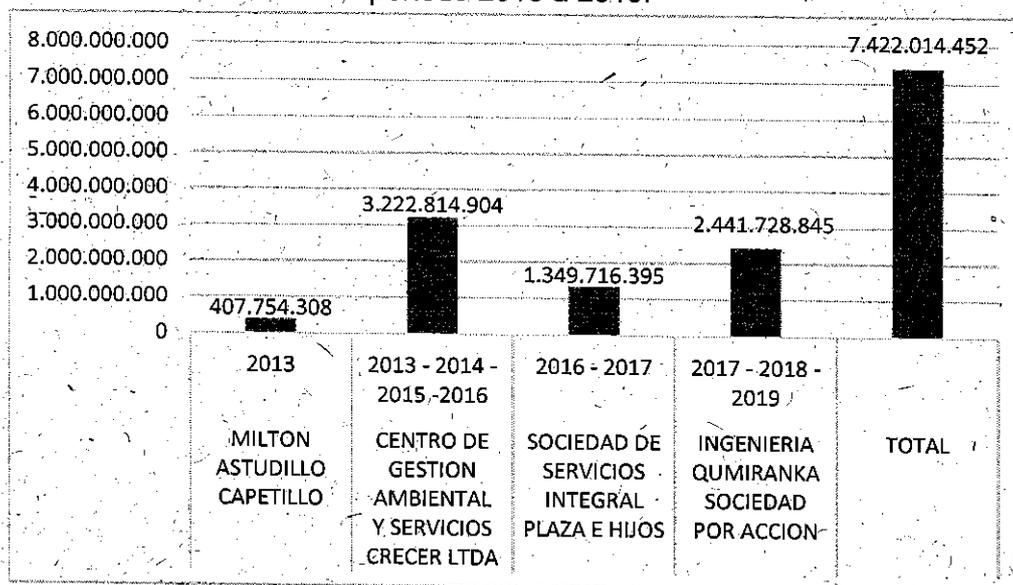

Fuente: Elaboración propia, Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Antofagasta, en virtud de los estados de pago proporcionados por la Municipalidad de Antofagasta, para el período 2013 a 2019, respecto del costo incurrido en el vertedero "La Chimba".

Apelaciones de Antofagasta, Rol de Ingreso Corte N° 8.609-2019. Finalmente, el trato directo fue regularizado mediante el decreto alcaldicio N° 2.252 de fecha 4 de diciembre de 2019.

²El valor del mes de noviembre, fue obtenido de las órdenes de compra N°s 2430-224-SE19 y 2430-225-SE19, por los costos fijos y variables correspondientes a tres (3) días de noviembre.

Mientras que para el cálculo del monto a pagar en el mes de diciembre de 2019, para efectos comparativos, se promedió el costo variable de los meses anteriores de enero a octubre de esa anualidad, por lo que el total de ese mes corresponde a un valor estimativo.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Ahora bien, sobre la contratación del servicio para el año 2020, se advirtió que, si bien la Municipalidad de Antofagasta dispuso el llamado a una nueva licitación pública para la operación del vertedero, ID N° 2430-50-LR19, "Servicio de Mantenimiento y Operación Vertedero Municipal Periodo 2019-2020", según consta en el decreto alcaldicio N° 1.792, de fecha 26 de septiembre de 2019, dicho proceso fue revocado mediante el decreto alcaldicio N° 2.160, de 27 de noviembre de igual anualidad, argumentando para ello que la convocatoria adolecía de vicios administrativos al considerar en la aclaratoria N° 3, numeral 3, el costo fijo como exento de IVA, y al omitir adjuntar un anexo a la licitación.

Finalmente, es dable señalar que mediante la resolución exenta N° 19022165, de 20 de diciembre de 2019, la SEREMI de Salud de Antofagasta, ordenó la clausura del vertedero "La Chimba" y estableció que los residuos sólidos domiciliarios y asimilables de la comuna deben ser dispuestos en el relleno sanitario "Chaqueta Blanca". Ello, como consecuencia de la sustitución de una multa de 1.000 UTM, impuesta a través de la resolución exenta N° 1902727, de 17 de abril de 2019, a la Municipalidad de Antofagasta, por infringir la normativa sanitaria.

Por otra parte, cabe precisar que este Organismo de Control ha efectuado diversas fiscalizaciones sobre el aludido recinto municipal, según consta a modo de ejemplo en el informe final de investigación especial N° 527, de 2018, sobre la ejecución del citado contrato de mantención asociado a la licitación pública ID N° 2430-54-LQ17, en el cual se evidenció, entre otras materias, la falta de cobro de multas por incumplimiento de la dotación de personal que debía mantener la empresa contratista, por un monto de \$ 230.188.602, por lo que este Ente Fiscalizador, a través del oficio N° 3.993, de 2019, remitió al Tribunal de Cuentas un reparo por el daño patrimonial causado a la Municipalidad de Antofagasta, el que fue acogido a trámite y notificado a los cuentadantes respectivos, según lo dispuesto en la resolución N° 73.314, de esa anualidad, de ese Juzgado, causa rol N° 146, de 2019, de ese origen.

- **Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Domiciliarios Sólidos y Asimilables "Chaqueta Blanca"**

Sobre la materia, es menester indicar que mediante la resolución exenta N° 1.007, de 28 de agosto de 2012, del Gobierno Regional de Antofagasta, en adelante GORE, se aprobó el convenio mandato entre ese organismo y la Municipalidad de Antofagasta, mandante y unidad técnica mandataria, respectivamente, para la ejecución del proyecto "Construcción Centro de Tratamiento y Disposición Final RSD", financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R., el cual incluía asignaciones presupuestarias para consultorías, terrenos y obras civiles, por un total de \$ 4.381.396.240.

Dicho convenio, en su cláusula décima indicaba que las partes acordaban que dentro de ciento cuarenta (140) días de tramitado dicho instrumento, la unidad técnica debería, al menos, haber llamado a la respectiva licitación del proyecto. Cabe precisar que a través de la resolución



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA

exenta N° 316, de 8 de abril de 2013, del GORE, el referido convenio mandato fue prorrogado en ciento cuarenta (140) días corridos.

Por otro lado, para ejecutar dicho proyecto, mediante el decreto N° 116, de 12 de diciembre de 2012, el Subsecretario de Bienes Nacionales (S) de la época, autorizó la venta directa del terreno fiscal ubicado en el km 6 de la ruta A-26, sector Chaqueta Blanca, a la Municipalidad de Antofagasta, acordando un precio de 11.302 (once mil trescientos dos) Unidades de Fomento, UF, cuyo monto equivalente ascendió a \$ 280.000.000, financiado en su oportunidad con aportes de la SUBDERE, a fin de que en ese lugar se realizara la construcción de una planta de recuperación y reciclaje junto con un relleno sanitario.

Luego, en virtud del convenio citado, por medio del decreto alcaldicio N° 713, de 27 de mayo de 2013, la Municipalidad de Antofagasta dispuso el llamado a la propuesta pública "Contrato por la Concesión Municipal del Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables, Comuna Antofagasta, II Región, Chile", ID N° 2430-30-LP13, por un monto de \$4.063.496.600. Dicha convocatoria fue declarada inadmisibles respecto de las ofertas recibidas por la autoridad comunal, a través del decreto alcaldicio N° 1.111, de 9 de julio de 2014, habiendo transcurrido cuatrocientos ocho (408) días desde el inicio de dicho proceso licitatorio.

Posteriormente, mediante el decreto alcaldicio N° 1.198, de 31 de julio de 2014, la entidad municipal efectuó un nuevo llamado a propuesta pública sobre la materia, denominado "Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables Comuna de Antofagasta, II Región, Chile", licitación ID N° 2430-55-LP14, y aprobó las bases administrativas especiales, bases técnicas y los respectivos anexos. En dicha licitación se estableció que el monto máximo disponible, para las etapas de diseño y construcción, ascendería a \$ 4.063.496.600, IVA incluido.

La aludida licitación fue adjudicada a través del decreto alcaldicio N° 507, de 15 de abril de 2015, a la empresa contratista Consorcio Santa Marta S.A., aprobándose el contrato respectivo mediante el decreto alcaldicio N° 638, de 5 de mayo de igual anualidad, por un total de \$ 4.061.020.915, IVA incluido, financiado con recursos del F.N.D.R.

Seguidamente, es del caso mencionar que el mentado contrato, contemplaba tres (3) etapas: la de diseño, por un monto de \$ 293.085.676, con un plazo de cien (100) días corridos; la de construcción, por un total de \$ 3.767.935.239, a ejecutarse en ciento treinta y seis (136) días corridos, ambas cantidades con IVA incluido; y la etapa de operación, por un valor de \$ 7.990, por cada tonelada ingresada al recinto, sin modelo de negocio y \$ 7.830, con dicho modelo de negocio, ambos valores exentos de IVA, por un periodo de 20 años no prorrogables.

Cabe indicar que dicho contrato sufrió una serie de modificaciones debido a aumentos de plazo para su ejecución, las que no se encontraban debidamente justificadas, según se observa en el informe.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA

final N° 242, de 2018, de este origen, habiendo transcurrido desde la última fecha de término de la construcción esperada, esto es desde el 20 de agosto de 2018, 486 días corridos al 19 de diciembre de 2019 -día anterior al de su apertura- sin que el relleno sanitario hubiera iniciado su etapa de operación. El detalle de las modificaciones señaladas se muestran a continuación:

Tabla N° 2: Detalle de las modificaciones de plazo efectuadas al proyecto, según se señala en el informe final N° 242, de 2018, de este origen.

MODIFICACIÓN N°	DECRETO ALCALDICIO APROBATORIO	PLAZO OTORGADO	DÍAS CORRIDOS OTORGADOS ACUMULADOS	FECHA DE TÉRMINO
Entrega de terreno	09-08-2016	136	136	23-12-2016
1	0087/25-01-2017	65	201	26-02-2017
2	0520/25-04-2017	120	321	26-06-2017
3	1.475/26-10-2017	90	411	24-09-2017
4	1.801/15-12-2017	150	561	21-02-2018
5	1.303/22-08-2018	180	741	20-08-2018

Fuente: Información extraída desde la documentación aportada por la Municipalidad de Antofagasta, relacionada con las modificaciones de plazo del contrato y lo expuesto en el informe final N° 242, de 2018, de este Organismo Fiscalizador.

Por su parte, se constató que desde el año 2015 -periodo en que ocurrió la adjudicación- a la fecha de este informe, diciembre de 2019, la empresa en comento ha emitido diez (10) estados de pago, los que consideran los conceptos de diseño y construcción del proyecto, por un monto de \$ 3.871.944.498, de los cuales, solo nueve (9) de ellos, por \$3.593.384.189, se encuentran pagados, mientras que el estado de pago N° 6, por un total de \$278.560.309, IVA incluido, aún está pendiente. Sin perjuicio de lo expuesto, para efectos de la determinación del costo total del proyecto, se considerarán ambas cifras, en el cálculo respectivo.

El detalle de los montos antes mencionados, se encuentra en el anexo N° 2 de este documento.

En este sentido, los costos totales asociados a dicha iniciativa, considerando los datos antes expuesto, totalizan \$ 4.192.260.096, según se resume en la siguiente tabla:

Tabla N° 3: Costos de relleno sanitario "Chaqueta Blanca".

PROYECTO-CHAQUETA BLANCA	VALOR (\$)	FINANCIAMIENTO
Compra del terreno año 2013	280.000.000	SUBDERE
Consultoría	40.315.598	Gobierno Regional de Antofagasta
Estados de pago de las etapas de Diseño y Construcción ¹	3.871.944.498	Gobierno Regional de Antofagasta
Total pagado	4.192.260.096	

Fuente: Elaboración propia, Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Antofagasta, respecto de la información recabada por este Organismo de Control.

¹ De los estados de pago de las etapas de Diseño y Construcción, el estado de pago N° 6, de 2019, de la etapa de Construcción, por un total de \$ 278.560.309, IVA incluido, a la fecha de este documento no ha sido pagado por el municipio, sin embargo, se encuentra devengado.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA

En lo pertinente, es dable indicar que este Organismo de Control, efectuó una fiscalización respecto de la ejecución del contrato de diseño y construcción en comento, según da cuenta el informe final de auditoría N° 242, de 2018, de este origen, en donde se comprobó que la entidad edilicia no cursó multas ascendentes a \$31.663.321, por la ausencia del profesional residente en el proyecto durante la etapa de construcción, y por \$ 946.733.291, por incumplimiento de las instrucciones impartidas por la inspección técnica de obras, bajo apercibimiento de que en caso de que no se cumpliera con el cobro de éstas, este Ente Fiscalizador, realizaría el reparo correspondiente en el Juzgado de Cuentas.

Al respecto, se verificó que la empresa contratista Consorcio Santa Marta S.A., interpuso ante el Tercer Juzgado de Letras Civil de Antofagasta, una demanda de incumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios en contra del indicado municipio, causa rol N° 3.354, de 2019, impugnando en esa sede judicial la procedencia de las multas que al efecto dispuso el ente edilicio, la que se encuentra en trámite a la fecha de este documento.

- Conclusión

En virtud del análisis realizado por esta Entidad Fiscalizadora, se advirtió que durante el periodo comprendido entre los años 2013 y 2019, las diferentes instituciones públicas citadas, han desembolsado, con las salvedades expuestas, un total de \$ 11.614.274.548, por concepto de tratamiento de Residuos Sólidos Domiciliarios, RSD, en los diversos contratos suscritos para la mantención del vertedero "La Chimba" y en el proyecto "Chaqueta Blanca".

De dicho monto, la Municipalidad de Antofagasta ha gastado más de 7 mil millones de pesos en el contrato de mantención del vertedero municipal "La Chimba", pese a que dicho recinto no cuenta con una resolución sanitaria para su funcionamiento, emitida por la autoridad competente, debiendo hacerse presente, además, que ese monto se podría ver incrementado al estar expuesta la entidad comunal al cobro de multas por incumplimiento de la normativa sanitaria por parte de la SEREMI de Salud de Antofagasta.

El resumen de los gastos que se indican, se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N° 4: Costo total ejecutado en materias relacionadas con el tratamiento de RSD, años 2013 al 2019.

CONTRATOS	TOTAL DE GASTOS ASOCIADOS (\$)
Costo total del servicio de mantención del vertedero "La Chimba"	7.422.014.452
Costo total a la fecha de este informe, incurrido en el proyecto "Chaqueta Blanca"	4.192.260.096



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA

CONTRATOS	TOTAL DE GASTOS ASOCIADOS (\$)
Total	11.614.274.548

Fuente: Elaboración propia Unidad de Control Externo Contraloría Regional de Antofagasta, en virtud de la información proporcionada por la Municipalidad de Antofagasta, para el período 2013 a 2019, relacionada con los estados de pago de ambos proyectos, cuya composición se detalla en la tabla N° 1 y la tabla N° 3, de este documento.

Lo expuesto, da cuenta de que la Municipalidad de Antofagasta ha debido mantener en forma paralela contrataciones relativas al tratamiento de residuos, en el Vertedero "La Chimba" y en "Chaqueta Blanca", en virtud de que no logró concretar dentro de los plazos estipulados el término de la construcción del citado relleno sanitario y el consecuente cierre del vertedero.

Cabe indicar además, que el proceso licitatorio vinculado a Chaqueta Blanca, sufrió una serie de retrasos, evidenciándose que, desde el primer llamado, el 27 de mayo de 2013, hasta la adjudicación de la propuesta, esto es, el 15 de abril de 2015, transcurrieron seiscientos ochenta y ocho (688) días corridos.

Por su parte, como se expresó anteriormente, se observó la existencia de una serie de modificaciones del contrato suscrito con la empresa contratista Consorcio Santa Marta S.A., aprobado mediante el decreto alcaldicio N° 638, de 5 de mayo de 2015, las que no se encuentran debidamente justificadas, e implicaron que el término de la etapa constructiva de la obra quedara fijado para el 20 de agosto de 2018, según consta en el decreto alcaldicio N° 1.303, de 2018. Ello se tradujo en que el plazo original de ciento treinta y seis (136) días, aumentara en setecientos cuarenta y un días (741) corridos.

En este sentido, se observó que desde el 20 de agosto de 2018 -fecha en que debió terminarse la etapa de construcción- al 19 de diciembre de 2019 -data anterior al de la apertura de Chaqueta Blanca-, transcurrieron 486 días corridos, sin que la empresa haya iniciado la operación del relleno sanitario.

Dicho retraso implicó que la Municipalidad de Antofagasta mantuviera vigente el contrato de operación del vertedero "La Chimba, lo que le significó desembolsar desde el 20 de agosto de 2018 al 31 de octubre de 2019 un monto de \$1.493.077.509, correspondiente a 29 estados de pago, mientras que por los meses de noviembre y diciembre, esta Entidad Fiscalizadora estima erogará la suma de \$113.217.032². Al respecto precisar que estas erogaciones, se podrían haber evitado en caso de que la entidad edilicia hubiera dispuesto la apertura de "Chaqueta Blanca". El detalle del gasto total que significa lo antes expuesto, por \$1.606.294.541, se muestra en el anexo N°3, de este documento.

Así, del análisis de los costos expuestos y las demoras advertidas, esta Contraloría General evidenció que el mentado



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA

municipio contravino los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, economicidad y de accionar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 3° y el artículo 8°, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Saluda atentamente a Ud.,

JORGE BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

→



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA

ANEXO N° 1

Pagos realizados por la Municipalidad de Antofagasta por el periodo 2013-2019,
por la mantención del vertedero "La Chimba"

FECHA	DECRETO DE PAGO N°	PROVEEDOR	MONTO (\$)**
25/01/2013	13000643	Milton Astudillo Capetillo	26.499.999
19/02/2013	13001110	Milton Astudillo Capetillo	14.734.309
04/03/2013	13001408	Milton Astudillo Capetillo	45.815.000
18/03/2013	13001772	Milton Astudillo Capetillo	45.815.000
23/04/2013	13002500	Milton Astudillo Capetillo	45.815.000
11/06/2013	13003242	Milton Astudillo Capetillo	45.815.000
25/06/2013	13003734	Milton Astudillo Capetillo	45.815.000
31/07/2013	13004457	Milton Astudillo Capetillo	45.815.000
02/09/2013	13005182	Milton Astudillo Capetillo	45.815.000
18/10/2013	13006219	Milton Astudillo Capetillo	45.815.000
14/11/2013	13006441	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	47.455.382
04/12/2013	13006828	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	508.810
04/12/2013	13006828	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	1.500.000
04/12/2013	13006828	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	1.500.000
04/12/2013	13006832	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	8.500.000
04/12/2013	13006832	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-1.408.816
09/12/2013	13006988	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	47.455.382
13/12/2013	13007494	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	47.455.382
20/01/2014	14000380	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	47.455.382
05/02/2014	14000620	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	8.500.000
05/02/2014	14000620	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-219.617
07/02/2014	14000621	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	8.500.000
07/02/2014	14000621	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	114.192
05/02/2014	14000622	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	8.500.000
05/02/2014	14000622	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	748.829
07/02/2014	14000624	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	8.500.000
07/02/2014	14000624	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-1.586.972
07/02/2014	14000625	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	8.500.000
07/02/2014	14000625	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-1.368.263
07/02/2014	14000626	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	8.500.000
07/02/2014	14000626	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	157.081
13/02/2014	14000806	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	1.748.435
14/02/2014	14000881	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	47.455.382
07/04/2014	14001060	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	8.975.222
07/04/2014	14001061	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	8.849.132
07/04/2014	14001062	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	6.670.349
07/04/2014	14001063	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	8.949.945
07/04/2014	14001064	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	7.656.059
07/04/2014	14001065	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	7.402.965
14/03/2014	14001417	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	47.455.382
02/04/2014	14001630	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	1.359.886
08/04/2014	14001631	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	1.489.789
02/04/2014	14001659	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	7.614.725
02/04/2014	14001661	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	7.906.512



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA

FECHA	DECRETO DE PAGO N°	PROVEEDOR	MONTO (\$)**
02/04/2014	14001662	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	8.678.124
25/04/2014	14001922	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	7.905.732
25/04/2014	14001927	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	9.091.306
14/04/2014	14002002	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	47.455.382
04/06/2014	14002249	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	8.500.000
04/06/2014	14002249	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	8.500.000
04/06/2014	14002249	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	8.500.000
04/06/2014	14002249	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	3.889.905
13/10/2014	14002250	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	10.579.959
12/05/2014	14002260	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	610.095
13/05/2014	14002579	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	47.455.382
10/06/2014	14003253	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	8.500.000
10/06/2014	14003253	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	20.078.790
20/06/2014	14003503	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	47.455.382
19/06/2014	14003509	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	11.276.972
19/06/2014	14003509	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	15.482.620
19/06/2014	14003509	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	3.247.868
19/06/2014	14003509	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-7.460
19/06/2014	14003511	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	28.240.638
19/06/2014	14003511	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	1.890.696
19/06/2014	14003511	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-131.334
03/07/2014	14003686	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	27.835.077
03/07/2014	14003686	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	2.000.000
03/07/2014	14003686	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-106.059
21/07/2014	14004153	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	47.455.382
07/08/2014	14004458	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	28.499.566
07/08/2014	14004458	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	1.076.153
15/09/2014	14005003	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	28.025.130
15/09/2014	14005003	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	1.934.667
05/09/2014	14005174	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	47.455.382
26/09/2014	14005268	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	13.398.096
25/09/2014	14005398	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	13.420.861
23/09/2014	14005563	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	47.455.382
02/10/2014	14005722	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	26.971.445
02/10/2014	14005722	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	3.093.578
02/10/2014	14005722	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-65.023
17/10/2014	14005858	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	14.000.000
17/10/2014	14005858	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-1.473.875
17/10/2014	14006144	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	49.733.240
24/10/2014	14006277	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	26.908.199
24/10/2014	14006277	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	3.016.872
06/11/2014	14006282	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	13.719.769
02/12/2014	14007054	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	49.733.240
26/12/2014	14007478	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	14.000.000
26/12/2014	14007478	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-178.653
10/12/2014	14007480	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	26.904.182
10/12/2014	14007480	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	3.151.563
10/12/2014	14007480	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-55.745



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA

FECHA	DECRETO DE PAGO N°	PROVEEDOR	MONTO (\$)**
19/12/2014	14007809	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	49.733.239
23/12/2014	14007825	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	28.609.024
23/12/2014	14007825	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	1.394.473
23/12/2014	14007825	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-3.497
21/01/2015	15000502	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	49.733.239
30/01/2015	15000737	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	28.665.173
30/01/2015	15000737	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	1.314.472
30/01/2015	15000737	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-98.102
12/02/2015	15000742	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	14.000.000
12/02/2015	15000742	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-709.522
20/02/2015	15001268	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	49.733.240
25/02/2015	15001382	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	28.826.025
25/02/2015	15001382	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	1.126.690
18/03/2015	15001879	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	49.733.240
06/04/2015	15001903	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	8.500.000
06/04/2015	15001903	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	8.500.000
06/04/2015	15001903	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	4.967.055
15/04/2015	15001885	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	14.000.000
15/04/2015	15002561	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	49.733.240
21/04/2015	15002637	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	1.863.916
21/04/2015	15002638	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	28.241.713
21/04/2015	15002638	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-105.629
18/05/2015	15003158	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	28.895.527
18/05/2015	15003158	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-77.313
18/05/2015	15003159	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	1.181.786
20/05/2015	15003307	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	49.733.240
02/06/2015	15003570	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	2.977.411
02/06/2015	15003572	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	27.794.975
02/06/2015	15003572	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-772.386
17/06/2015	15004134	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	49.733.240
02/07/2015	15003577	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	13.827.936
10/07/2015	15004710	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	26.771.982
10/07/2015	15004710	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	3.261.077
10/07/2015	15004710	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-33.059
14/07/2015	15004810	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	49.733.240
17/07/2015	15004858	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	27.783.268
17/07/2015	15004858	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	2.314.948
17/07/2015	15004858	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-98.216
28/07/2015	15004700	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	14.000.000
29/07/2015	15004863	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	14.000.000
02/09/2015	15005159	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	14.000.000
02/09/2015	15005163	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	14.000.000
02/09/2015	15005163	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-2.694
02/09/2015	15005169	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	14.000.000
02/09/2015	15005169	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-607.069
02/09/2015	15005170	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	14.000.000
02/09/2015	15005170	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-666.606
02/09/2015	15005174	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-13.902.787



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA

FECHA	DECRETO DE PAGO N°	PROVEEDOR	MONTO (\$)**
02/09/2015	15005174	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-4.138
02/09/2015	15005683	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	49.733.240
03/09/2015	15005806	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	29.093.806
03/09/2015	15005806	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	1.443.169
03/09/2015	15005806	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-536.975
22/09/2015	15006337	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	49.733.240
29/09/2015	15005799	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	14.000.000
14/10/2015	15006942	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	14.000.000
14/10/2015	15006980	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	28.245.801
14/10/2015	15006980	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	1.671.858
19/10/2015	15005177	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	10.824.343
09/11/2015	15007358	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	47.455.382
16/11/2015	15007731	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	45.000.000
16/11/2015	15007732	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	45.000.000
24/11/2015	15007982	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	47.455.382
21/12/2015	15008938	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	47.455.382
12/01/2016	16000103	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	45.000.000
21/01/2016	16000669	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	47.455.382
09/02/2016	16001056	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	45.188.406
09/02/2016	16001056	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-188.406
23/02/2016	16001389	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	47.455.382
29/02/2016	16001410	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	45.000.000
21/03/2016	16002061	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	47.455.382
21/03/2016	16002063	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	45.000.000
27/04/2016	16002972	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	42.709.844
27/04/2016	16002973	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	4.745.538
09/05/2016	16003169	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	45.625.565
09/05/2016	16003169	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	-625.565
23/05/2016	16003720	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	47.455.382
23/05/2016	16003742	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	45.000.000
20/06/2016	16004429	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	47.455.382
20/06/2016	16004468	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	45.000.000
19/07/2016	16005253	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	47.455.382
19/07/2016	16005255	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	45.000.000
25/08/2016	16006009	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	47.455.382
25/08/2016	16006010	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	45.000.000
13/09/2016	16006498	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	4.745.538
12/09/2016	16006500	Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Limitada	7.534.716
24/11/2016	16008083	Bci Factoring S.A.	42.503.248
24/11/2016	16008174	Bci Factoring S.A.	45.539.194
24/11/2016	16008176	Bci Factoring S.A.	51.276.283
25/11/2016	16008182	Sociedad de Servicios Integral Plaza e Hijos	729.921
13/12/2016	16008615	Banco Estado	54.477.076
13/12/2016	16008619	Banco Estado	925.960
15/12/2016	16009042	Banco Estado	45.539.194
30/12/2016	16009337	Banco Estado	54.343.219
30/12/2016	16009345	Sociedad de Servicios Integral Plaza e Hijos	658.246
06/01/2017	17000009	Banco Estado	45.539.194



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFÁGASTA

FECHA	DECRETO DE PAGO N°	PROVEEDOR	MONTO (\$)**
11/01/2017	17000269	Sociedad de Servicios Integral Plaza e Hijos	1.349.544
11/01/2017	17000329	Sociedad de Servicios Integral Plaza e Hijos	55.441.942
03/02/2017	17000788	Banco Estado	45.539.194
17/02/2017	17001150	Sociedad de Servicios Integral Plaza e Hijos	57.288.626
17/02/2017	17001150	Sociedad de Servicios Integral Plaza e Hijos	258.625
05/04/2017	17002056	Sociedad de Servicios Integral Plaza e Hijos	45.678.962
30/03/2017	17002098	Banco Estado	56.104.439
31/03/2017	17002114	Sociedad de Servicios Integral Plaza e Hijos	5.678.308
28/04/2017	17002819	Bci Factoring S.A.	51.533.184
28/04/2017	17002822	Sociedad de Servicios Integral Plaza e Hijos	3.766.164
28/04/2017	17002822	Sociedad de Servicios Integral Plaza e Hijos	45.678.962
04/05/2017	17002907	Bci Factoring S.A.	58.514.098
04/05/2017	17002910	Sociedad de Servicios Integral Plaza e Hijos	1.246.372
15/05/2017	17003277	Sociedad de Servicios Integral Plaza e Hijos	45.678.962
01/06/2017	17003720	Bci Factoring S.A.	45.678.962
09/06/2017	17003841	Sociedad de Servicios Integral Plaza e Hijos	5.151.596
09/06/2017	17003854	Bci Factoring S.A.	52.643.565
03/07/2017	17004450	Bci Factoring S.A.	45.678.962
13/07/2017	17004881	Incofin S.A.	58.365.193
14/07/2017	17004893	Sociedad de Servicios Integral Plaza e Hijos	4.464.584
30/08/2017	17005962	Bci Factoring S.A.	45.678.962
30/08/2017	17005963	Incofin S.A.	56.222.611
30/08/2017	17005964	Bci Factoring S.A.	5.861.855
11/09/2017	17006173	Incofin S.A.	46.200.251
15/09/2017	17006639	Sociedad de Servicios Integral Plaza e Hijos	5.583.242
14/09/2017	17006645	Incofin S.A.	56.279.147
30/11/2017	17008369	Incofin S.A.	58.306.386
30/11/2017	17008373	Sociedad de Servicios Integral Plaza e Hijos	2.111.912
30/11/2017	17008374	Incofin S.A.	46.200.250
15/12/2017	17008999	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	60.941.465
15/12/2017	17009002	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	37.343.307
12/01/2018	18000424	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	64.926.108
12/01/2018	18000424	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	41.492.562
15/02/2018	18001089	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	41.492.562
15/02/2018	18001089	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	64.923.365
13/03/2018	18001859	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	41.492.562
13/03/2018	18001859	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	62.907.004
18/04/2018	18002851	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	41.492.562
18/04/2018	18002851	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	64.906.905
18/05/2018	18003695	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	63.135.483
18/05/2018	18003695	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	41.492.562
22/06/2018	18004527	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	62.118.146
22/06/2018	18004527	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	41.492.562
23/07/2018	18005250	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	63.784.587
23/07/2018	18005250	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	41.492.562
06/09/2018	18006362	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	98.211
24/09/2018	18006940	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	64.996.398
24/09/2018	18006940	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	42.178.568



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA

FECHA	DECRETO DE PAGO N°	PROVEEDOR	MONTO (\$)**
19/10/2018	18007630	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	- 61.757.858
19/10/2018	18007630	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	42.178.568
21/11/2018	18008355	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	64.999.259
21/11/2018	18008355	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	42.178.568
17/12/2018	18009097	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	64.980.362
17/12/2018	18009097	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	42.178.568
18/01/2019	19000429	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	64.726.293
18/01/2019	19000429	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	42.178.568
22/02/2019	19000973	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	65.380.509
22/02/2019	19000973	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	42.655.314
20/03/2019	19001769	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	60.436.801
20/03/2019	19001769	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	42.655.314
11/04/2019	19002430	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	65.245.604
11/04/2019	19002430	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	42.655.314
20/05/2019	19003229	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	64.030.977
20/05/2019	19003229	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	42.655.314
20/06/2019	19004142	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	64.272.719
20/06/2019	19004142	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	42.655.316
19/07/2019	19004833	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	63.103.023
19/07/2019	19004833	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	42.655.314
23/08/2019	19005591	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	65.494.849
23/08/2019	19005591	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	43.318.150
30/09/2019	19006585	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	65.486.513
30/09/2019	19006585	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	43.318.150
17/10/2019	19007269	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	61.288.957
17/10/2019	19007269	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	43.318.150
MONTO TOTAL PAGADO			7.308.797.420
03/11/2019	N/A*	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	7.777.845
31/12/2019	N/A**	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	105.439.187
MONTO PENDIENTE DE PAGO			113.217.032
COSTO TOTAL QUE SIGNIFICARÁ EL PROYECTO			7.422.014.452

Fuente: Elaboración propia, Unidad de Control Externo Contraloría Regional de Antofagasta, en virtud de la información obtenida de los mayores contables de la cuenta Servicios de Aseo, dispuesto por la Municipalidad de Antofagasta.

* Valor obtenido de las órdenes de compra N° 2430-224-SE19 y 2430-225-SE19, por los costos fijos y variables correspondientes a tres (3) días de noviembre.

** Valor correspondiente al eventual pago que el municipio debería efectuar en diciembre por el trato directo que mantiene con la empresa Ingeniería Qumiranka SpA. Cabe precisar, que dicha erogación se encuentra judicializada según consta en la causa rol N° 8609-2019, interpuesta en la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

*** Los montos negativos corresponden a notas de crédito emitidas por el proveedor respectivo.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA

ANEXO N° 2

Listado de pagos realizados periodo 2015-2019, por ejecución proyecto
"Chaqueta Blanca"

ETAPA	ESTADO DE PAGO	DECRETO DE PAGO N°	FECHA ESTADO DE PAGO	MONTO (\$)
Diseño	1	1.436	30/11/2015	117.234.270
Diseño	2	1.117	31/08/2016	175.851.406
Construcción	Anticipo	533	29/05/2015	376.793.542
Construcción	1	59	19/01/2017	1.019.104.507
Construcción	2	61	20/01/2017	739.203.063
Construcción	3	200	17/02/2017	334.600.166
Construcción	4	294	15/03/2017	363.706.606
Construcción	4	1.908	29/12/2017	148.044.452
Construcción	5	4.670	28/09/2018	318.846.177
MONTO TOTAL PAGADO				3.593.384.189
Construcción	6	Aún no ha sido pagado		278.560.309
MONTO PENDIENTE DE PAGO				278.560.309
COSTO DEL PROYECTO A LA FECHA DEL PRESENTE ANÁLISIS				3.871.944.498

Fuente: Elaboración propia Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Antofagasta, en virtud de los emolumentos dispuestos por la Municipalidad de Antofagasta y el Gobierno Regional de Antofagasta.
* Pagos asociados a la Asesoría la Inspección Fiscal, AITO, ejecutados por el Gobierno Regional de Antofagasta.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA

ANEXO N° 3

Listado de pagos realizados por la Municipalidad de Antofagasta respecto del vertedero "La Chimba", desde el 20 de agosto de 2018.

N°	FECHA	DECRETO DE PAGO N°	PROVEEDOR	MONTO (\$)
1	06/09/2018	18006362	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	98.211
2	24/09/2018	18006940	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	64.996.398
3	24/09/2018	18006940	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	42.178.568
4	19/10/2018	18007630	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	61.757.858
5	19/10/2018	18007630	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	42.178.568
6	21/11/2018	18008355	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	64.999.259
7	21/11/2018	18008355	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	42.178.568
8	17/12/2018	18009097	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	64.980.362
9	17/12/2018	18009097	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	42.178.568
10	18/01/2019	19000429	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	64.726.293
11	18/01/2019	19000429	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	42.178.568
12	22/02/2019	19000973	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	65.380.509
13	22/02/2019	19000973	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	42.655.314
14	20/03/2019	19001769	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	60.436.801
15	20/03/2019	19001769	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	42.655.314
16	11/04/2019	19002430	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	65.245.604
17	11/04/2019	19002430	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	42.655.314
18	20/05/2019	19003229	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	64.030.977
19	20/05/2019	19003229	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	42.655.314
20	20/06/2019	19004142	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	64.272.719
21	20/06/2019	19004142	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	42.655.316
22	19/07/2019	19004833	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	63.103.023
23	19/07/2019	19004833	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	42.655.314
24	23/08/2019	19005591	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	65.494.849
25	23/08/2019	19005591	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	43.318.150
26	30/09/2019	19006585	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	65.486.513
27	30/09/2019	19006585	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	43.318.150
28	17/10/2019	19007269	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	61.288.957
29	17/10/2019	19007269	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	43.318.150
MONTO TOTAL PAGADO				1.493.077.509
30	03/11/2019	N/A*	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	7.777.845
31	31/12/2019	N/A**	Ingeniería Qumiranka Sociedad por Acción	105.439.187
MONTO PENDIENTE DE PAGO				113.217.032
TOTAL				1.606.294.541

Fuente: Elaboración propia, Unidad de Control Externo Contraloría Regional de Antofagasta, en virtud de la información obtenida de los mayores contables de la cuenta Servicios de Aseo, dispuesto por la Municipalidad de Antofagasta.

* Valor obtenido de las órdenes de compra N°s 2430-224-SE19 y 2430-225-SE19, por los costos fijos y variables correspondientes a tres (3) días de noviembre.

** Valor correspondiente al eventual pago que el municipio debería efectuar en diciembre por el trato directo que mantiene con la empresa Ingeniería Qumiranka SpA. Cabe precisar, que dicha erogación se encuentra judicializada según consta en la causa rol N° 8609-2019, interpuesta en la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
