





SUBDERE

Chile lo hacemos todos

—— Gobierno de Chile ——



Reconstrucción Antofagasta-Atacama Aluvión Marzo 2015

1.- Contexto

El evento hidrometeorológico de los días 24 y 25 de marzo, con lluvias en zonas altas de la región de Atacama, generó el desborde de cauces inundando zonas aledañas de pendiente más bajas, trayendo como consecuencia pérdida de vidas humanas y graves daños en viviendas e infraestructura pública en las comunas de; Chañaral, Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla y Alto del Carmen.

Principales efectos

- Inundación y acumulación de sedimentos en gran parte de las ciudades afectadas;
- Colapso de Red Vial Básica y Red de Alcantarillado;
- Desbordes de ríos por estrangulamiento de cauces;
- Aluvión de barro y rocas en áreas rurales de difícil acceso;
- Áreas definidas como zonas de riesgo totalmente sobrepasadas;
- Pérdida de viviendas en diversas zonas de las ciudades afectadas;
- Aislamiento entre zonas pobladas.

2.- Plan de Reconstrucción Atacama


Dirección de Presupuestos
Reg. N° 225/BB
09.09.2015
2 5 3 8

ORD. N° 2354
ANT.: No hay.
MAT.: Programa de Emergencia, Rehabilitación y Reconstrucción de la Región de Atacama 2015-2020.

SANTIAGO, 11 SEP 2015

DE : MINISTRO DE HACIENDA
A : SR. MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

En relación a lo señalado en la materia, informo a Ud. que, sobre la base del Documento "Juntos por Atacama. Por una mejor región" presentado por la Intendencia de la 3ª Región, la Dirección de Presupuestos efectuó una revisión detallada de los proyectos allí contenidos, en coordinación con los Ministerios involucrados, dando origen al documento "Programa de Emergencia, Rehabilitación y Reconstrucción de la Región de Atacama 2015-2020, el cual se adjunta al presente oficio.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,


RODRIGO VALDÉS PULIDO
MINISTRO DE HACIENDA

DISTRIBUCIÓN

- Ministro del Interior y Seguridad Pública
- Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo
- Subdirección de Presupuestos
- Oficina Partes, DIPRES

08047/2015



- Programa de Emergencia, Rehabilitación y Reconstrucción de la Región de Atacama 2015-2020.
- Costo total estimado \$900 mil millones, equivalente a US\$ 1.500 millones (valor US\$ 600).
- US\$ 500 millones de la ley reservada del Cobre.
- US\$ 1.000 de presupuestos futuros (reasignaciones).
- Plan de Reconstrucción de Atacama
 - 96 iniciativas.
 - Costo total M\$ 355.914.536.

3.- Rol SUBDERE

A- El plan de reconstrucción Atacama se obtiene del Ord. 2354 emitido por el Ministerio de Hacienda dirigido al Ministerio del Interior con fecha 11-09-2015. Para la gestión del Plan se constituye un directorio el cual está conformado por:

1. Intendenta Región de Atacama
2. Gobernadora de la Provincia Copiapó
3. Gobernadora de la Provincia del Huasco
4. Gobernador de la Provincia de Chañaral
5. SEREMI de Gobierno
6. SEREMI de MINVU
7. SEREMI de OO PP
8. SEREMI Economía, Fomento y Turismo
9. SEREMI de Minería
10. SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones
11. SEREMI de Agricultura
12. SEREMI de Desarrollo Social
13. SEREMI Energía
14. Director Regional de Planeamiento del MOP
15. Director Regional de Obras Hidráulicas (DOH)
16. Director Regional de Vialidad
17. Director Regional SERVIU
18. Jefe de División de Análisis Control y Control de Gestión – GORE
19. Jefe de División de Planificación DIPLADE – GORE
20. Jefe de División de Administración y Finanzas – GORE
21. Jefe del Departamento de Presupuesto GORE
22. Presidente Consejero Regional CORE.

- RoI SUBDERE

B- La Intendencia de la Región de Atacama designa como Secretaría Técnica a la Unidad Regional SUBDERE de Atacama.

C- La Unidad Regional de SUBDERE, de acuerdo al procedimiento establecido por DIPRES, recopila la información del gasto efectuado por cada Ministerio, convoca las reuniones las reuniones de directorio e informa de los avances y modificaciones realizadas al plan de reconstrucción.

4.- Seguimiento

ORD. N° 24

ANT:

MAT: Envía actualización Plan de Reconstrucción Atacama.

COPIAPO, 5 ENE. 2017

DE: INTENDENTE DE LA REGIÓN DE ATACAMA

A : SR. MAHMUD ALEUY PEÑA Y LILLO
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR

Junto con saludar cordialmente, el presente tiene por objeto enviar actualización del Plan de Reconstrucción Atacama.

El carácter de las modificaciones se basa en la reestructuración y optimización del plan, de acuerdo a las necesidades visualizadas tras la catástrofe ocurrida los días 24 y 25 de marzo 2015.

Por tal motivo, se ajustó la cartera, a través de la selección y filtración de iniciativas donde se incorporaron, ajustaron nombres o se desestimaron del Plan original de reconstrucción, a fin de pertinencia, optimizar recursos y esfuerzos en proyectos que contribuyan a la recuperación y desarrollo de la Región.

Lo anterior, para informar al Consejo de Ministros sobre las modificaciones realizadas en Plan de Reconstrucción Atacama.

Saluda atentamente a Us.

MIGUEL VARGAS CORREA
INTENDENTE DE LA REGIÓN DE ATACAMA

MVC/OMC/cga
c.c.:
- Jefe División Gobierno Interior
- Jefe URS Atacama
- SEREMI MINVU Atacama
- Archivo

UNIDAD REGIONAL SUBDERE
REGION DE ATACAMA

- Ord. 24 05/01/2017, de Intendencia de Atacama dirigido a Subsecretario de Interior.
- Informa de las Modificaciones a la iniciativas del Plan de Reconstrucción de Atacama.
- La Propuesta se basa en la información recopilada de los Directorios de Reconstrucción N° 8 y N° 9.

Seguimiento

ORD. N° 208 /
ANT: Reunión Directorio Plan Atacama de 27 febrero 2018.
MAT: Envío Plan de Reconstrucción Atacama 2017.

COPIAPO, 02 MAR 2018

DE : INTENDENTA DE LA REGIÓN DE ATACAMA
A : SR. MAHMUD ALEUY PEÑA Y LILLO
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR

Junto con saludar cordialmente, me permito informar a Us. para su consideración, el acuerdo suscrito por los integrantes del Directorio del Plan de Reconstrucción Atacama.

En reunión realizada el día 27 de febrero 2018, se procede analizar el estado del Plan de Reconstrucción Atacama, observando que las necesidades visualizadas tras las catástrofes ocurridas los días 11 y 12 de mayo 2017, son de tal magnitud que debe tener un tratamiento igual al Plan que está en ejecución, y se propone la generación de un Plan de Reconstrucción Atacama 2017. Su listado permite reflejar los proyectos, acorde a la realidad ocurrida, satisfacer sus necesidades, a su vez facilita su seguimiento, en cuanto a plazos de ejecución y término.

Por lo tanto, se presenta Plan de Reconstrucción Atacama 2017, con 76 iniciativas de proyectos, para lo cual se adjunta listado al respecto, con un monto estimado de presupuesto en M\$ 107.027.830 (miles de pesos).

Lo anterior, para informar al Comité de Ministros sobre este nuevo Plan de Reconstrucción Atacama 2017.

Saluda atentamente a Us.

ALEXANDRA NUÑEZ SORICH
INTENDENTA DE LA REGIÓN DE ATACAMA

UNIDAD REGIONAL SUBDERE
REGION DE ATACAMA

ANEXO 1
1.- Jefe de División Gobierno Interior (a) Luis Carvajal G.
2.- Jefe Unidad de Coordinación de Reconstrucción e Información Territorial Pamela Morales R.
3.- Jefe UPR Atacama Oscar Muñoz G.
4.- SEREMI MINU Atacama Rodrigo Ocaranda S.
5.- SEREMI MOP Atacama César González P.
6.- Unidad Gestión y Desarrollo SUBDERE Analía Carvajal G.
7.- Archivos

ORD. N° 209 /
ANT: ORD. N° 74, de enero 2017, de esta Intendencia Regional.
Actualización Plan Atacama de 2015.
Reunión Directorio Plan Atacama de 27 febrero 2018.
MAT: Envío Actualización Plan de Reconstrucción Atacama 2015.

COPIAPO, 02 MAR 2018

DE : INTENDENTA DE LA REGIÓN DE ATACAMA
A : SR. MAHMUD ALEUY PEÑA Y LILLO
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR

Junto con saludar cordialmente, el presente tiene por objetivo enviar actualización del Plan de Reconstrucción Atacama 2015, el cual contiene los respectivos proyectos.

En reunión de Directorio del Plan de Reconstrucción Atacama, se acordó ajustar la cartera, de acuerdo a lo que efectivamente los Servicios Públicos van a desarrollar y ejecutar. Se priorizó a un cambio de monto de un proyecto, a eliminar un proyecto por ser financiado con fondos privados y nuevos proyectos que no se van a ejecutar, los cuales fueron plenamente justificados por el servicio público correspondiente.

El Plan de Reconstrucción Atacama 2015, quedará con 86 iniciativas de proyectos, con un monto estimado de presupuesto en M\$ 456.233.474 (miles de pesos), sin considerar la Planta Desoladora.

Lo anterior, para informar al Comité de Ministros sobre las modificaciones realizadas en Plan de Reconstrucción Atacama 2015.

Saluda atentamente a Us.

ALEXANDRA NUÑEZ SORICH
INTENDENTA DE LA REGIÓN DE ATACAMA


UNIDAD REGIONAL SUBDERE
REGION DE ATACAMA

FECHA RECEPCION: 05 MAR 2018
FOLIO N° 86

ANEXO 1
1.- Jefe de División Gobierno Interior (a) Luis Carvajal G.
2.- Jefe Unidad de Coordinación de Reconstrucción e Información Territorial Pamela Morales R.
3.- Jefe UPR Atacama Oscar Muñoz G.
4.- SEREMI MINU Atacama Rodrigo Ocaranda S.
5.- SEREMI MOP Atacama César González P.

- Ord. 208 02/03/2018, de Intendencia de Atacama dirigido a Subsecretario de Interior.
- Informa del Anexo de Reconstrucción evento climático mayo/2017
- Ord. 209 02/03/2018, de Intendencia de Atacama dirigido a Subsecretario de Interior.
- Informa de la cartera definitiva para el Plan de Reconstrucción Atacama 2015-2020
 - 86 Iniciativas
 - Monto total M\$ 469.509.750

5.- Flujograma proceso de Información Seguimiento Plan de reconstrucción

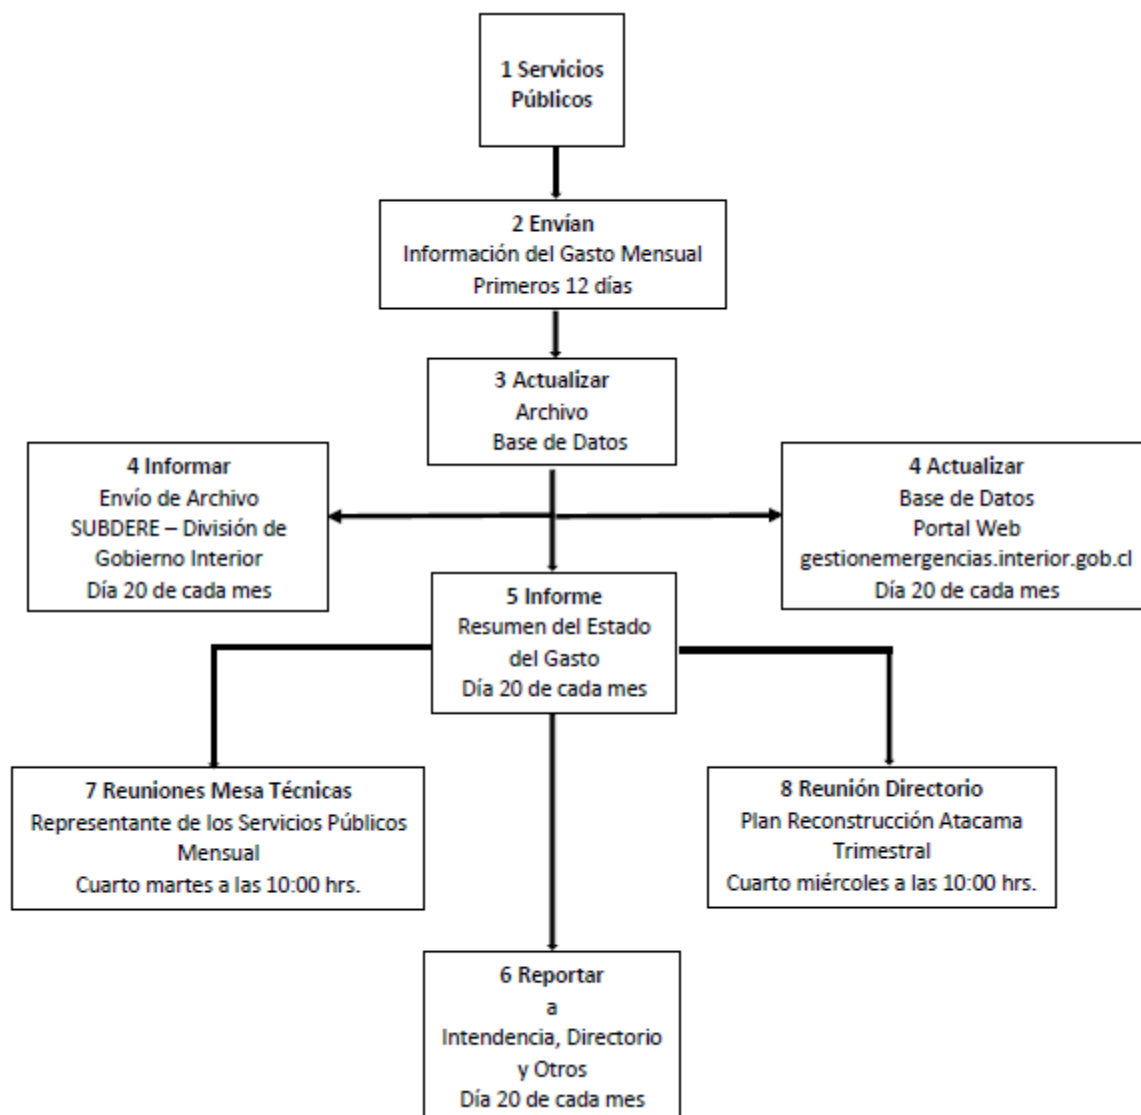

- En base al Plan de Reconstrucción de Atacama diseñado el año 2015, se tiene que al 31 de mayo de 2018:

El presupuesto asciende a M\$469.509.750

El gasto en M\$ 251.227.263, que equivale a un 53,51 % de avance.

- De los montos monitoreados, se distingue que obedecen a las asignaciones regulares de cada Ministerio de acuerdo a la Ley de Presupuesto de los años 2015 a 2018, sumando los montos asignados el año 2015 al FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional).


- A la fecha, se han realizado once directorios de Reconstrucción, el último con fecha 27 de febrero del presente año.
- La cartera actual, de 86 iniciativas, fue discutida y sancionada en dicho directorio. Actualmente, es la carta de navegación para el seguimiento y control de los proyectos de reconstrucción.
- La información que SUBDERE presenta es obtenida directamente de la Unidad Regional de SUBDERE en Atacama, que fue designada como Secretaría Técnica del Plan por parte de la Intendencia Regional.
- Sobre cartera proyectos Antofagasta- Tal Tal, no se constituyó plan específico, ya que los daños fueron focalizados. Se levantan iniciativas específicas en las comunas mencionadas por un total M\$10.213.427, según información provista por la Unidad de Gestión y Emergencias Subsecretaría del Interior.
- Tanto para el Plan Atacama, como para la cartera Antofagasta-Tal Tal, es imposible determinar si los recursos provienen del incremento establecido en la Ley N° 20.833.

Cartera Plan Atacama

		Plan actualizado (86 Iniciativas)		
		PPTO ORIGINAL (96)	PPTO FINAL (86)	Gastos acumulado
AGRICULTURA		\$ 22.100.000	\$ 4.473.000	\$ 4.473.000
MINERIA		\$ 2.200.000	\$ 1.218.349	\$ 1.218.349
MTT		\$ 500.000	\$ -	\$ -
ECONOMIA		\$ 1.050.000	\$ 2.718.091	\$ 2.501.952
TRABAJO		\$ 150.000	\$ -	\$ -
MINVU		\$ 124.132.441	\$ 123.758.459	\$ 66.839.549
MOP		\$ 187.556.824	\$ 260.319.409	\$ 130.253.328
INTERIOR	INTERIOR	\$ -	\$ 673.301	\$ 673.301
	SUBDERE	\$ 2.900.000	\$ 6.458.977	\$ 521.870
	FNDR	\$ 15.325.271	\$ 57.440.178	\$ 32.295.928
MINEDUC		\$ -	\$ 4.874.188	\$ 4.874.188
MINSAL		\$ -	\$ 5.180.579	\$ 5.180.579
DEPORTES		\$ -	\$ 2.395.219	\$ 2.395.219
TOTAL M\$		\$ 355.914.536	\$ 469.509.750	\$ 251.227.263
TOTAL US\$		\$ 593.190.893	\$ 782.516.250	\$ 418.712.105

ITEM	PLAN RECONSTRUCCION M\$	PLAN RECONSTRUCCION US\$	GASTO ACUMULADO M\$	GASTO ACUMULADO US\$
GASTOS EMERGENCIA	\$ 103.763.000	\$ 172.938.333	\$ 103.763.000	\$ 172.938.333
PLAN RECONSTRUCCION	\$ 469.509.750	\$ 782.516.250	\$ 251.227.263	\$ 418.712.105
DESALADORA	\$ 150.000.000	\$ 250.000.000	\$ 43.566.000	\$ 72.610.000
TOTAL	\$ 723.272.750	\$ 1.205.454.583	\$ 398.556.263	\$ 664.260.438

REGIÓN	COMUNA	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR	ETAPA	MONTO (M\$)	ESTADO
Antofagasta	No aplica	CONSERVACIÓN PLURIANUAL DE VÍAS URBANAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA (4 CONTRATOS)	MINVU	EJECUCIÓN	2.548.040	TERMINADO
Antofagasta	Antofagasta	ESTUDIO DE RIESGO Y ACTUALIZACIÓN PRC ANTOFAGASTA	MINVU	ESTUDIO	128.250	PARALIZADO
Antofagasta	Antofagasta	CONSERVACIÓN VÍAS URBANAS DIVERSOS SECTORES 2014 ANTOFAGASTA	MINVU	EJECUCIÓN	2.294.928	TERMINADO
Antofagasta	Antofagasta	PROYECTO DE AEROFOTOGRAMETRÍA DE LAS ÁREAS URBANAS Y CENTROS POBLADOS DE LA ZONA NORTE DECLARADA CATÁSTROFE POR EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS (REGIÓN ANTOFAGASTA Y ATACAMA)	MINVU	ESTUDIO	0	TERMINADO
Antofagasta	Antofagasta	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 23° LLAMADO REGIÓN ANTOFAGASTA	MINVU	EJECUCIÓN	0	TERMINADO
Antofagasta	Antofagasta	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 24° LLAMADO REGIÓN ANTOFAGASTA	MINVU	EJECUCIÓN	4.407.209	TERMINADO
Antofagasta	Taltal	PROGRAMA DE EMERGENCIA PRODUCTIVA TALTAL 2015	ECONOMÍA	EJECUCIÓN	250.000	TERMINADO
Antofagasta	Taltal	PROGRAMA RECONSTRUCCIÓN ASISTENCIA MINERÍA ARTESANAL-TALTAL	GORE	EJECUCIÓN	450.000	EJECUCIÓN
Antofagasta	Taltal	ESTUDIO DE RIESGO Y ACTUALIZACIÓN PRC TALTAL	MINVU	EJECUCIÓN	135.000	EJECUCIÓN
					10.213.427	



SUBDERE

Chile lo hacemos todos

—— Gobierno de Chile ——

