



“MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS”

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2024

JESSICA LÓPEZ SAFFIE
Ministra de Obras Públicas



16 ABRIL 2024

LÍNEAS DE ACCIÓN MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

1

INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y
CONECTIVIDAD



2

SEGURIDAD HÍDRICA




3

DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL,
PRODUCTIVO Y CIENTÍFICO



4

SEGURIDAD CIUDADANA Y ANTE
DESASTRES NATURALES Y
EMERGENCIAS



PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES MOP – PROPIR 2024

MZ NORTE
21%

MZ CENTRO
34%

MZ SUR
27%

MZ AUSTRAL
19%



Programa público de inversión regional PROPIR MOP 2024

Iniciativas de Inversión por Región.

MZ	REGIÓN	MONTO 2024(\$MILES)	PORCENTAJE
MZ NORTE	Arica y Parinacota	141.808.869	4%
	Tarapacá	64.443.216	2%
	Antofagasta	174.714.861	5%
	Atacama	175.614.946	5%
MZ CENTRO	Coquimbo	137.216.266	4%
	Valparaíso	208.770.731	6%
	Metropolitana de Santiago	464.082.637	13%
	O'Higgins	164.366.720	5%
	Maule	271.403.224	8%
MZ SUR	Ñuble	148.356.977	4%
	Biobío	255.651.239	7%
	La Araucanía	256.004.305	7%
	Los Ríos	224.838.283	6%
	Los Lagos	343.661.022	10%
MZ AUSTRAL	Aysén	120.028.731	3%
	Magallanes y de la Antártica Chilena	157.677.081	4%
	Interregional	269.079.383	8%
Total Programa Público de Inversiones Regionales (PROPIR) 2024		3.577.718.491	100%

ST 31
\$3,57
billones



Programa Público de Inversión Regional PROPIR MOP 2024

Distribución de Presupuesto por Servicios

SERVICIOS	MONTO 2024(\$MILES)
Dirección de Aeropuertos	137.741.639
Dirección de Arquitectura	44.423.031
Dirección de Obras Hidráulicas	278.606.870
Dirección de Obras Portuarias	127.117.895
Dirección de Planeamiento	1.220.741
Dirección de Vialidad	1.944.163.937
Dirección General de Aguas	19.176.997
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	669.104.057
Instituto Nacional de Hidráulica	330.062
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	251.696.642
Conservaciones por Administración Directa – Dirección de Vialidad	101.852.122
Conservaciones por Administración Directa – Dirección de Aeropuertos	1.799.011
Superintendencia de Servicios Sanitarios	485.486
TOTAL GENERAL	3.577.718.491

PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES MOP – PROPIR 2024

LA INVERSIÓN DE \$3,58 BILLONES SE DISTRIBUYE EN LOS SIGUIENTES EJES:



(*) Considera 51 proyectos en cartera, que se encuentran en procesos de adjudicación, licitación, precalificación o en desarrollo.

PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN REGIONAL – PROPIR 2024




PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN REGIONAL PROPIR MOP 2024

Cartografía Regional de Iniciativas de Inversión



Abril 2024

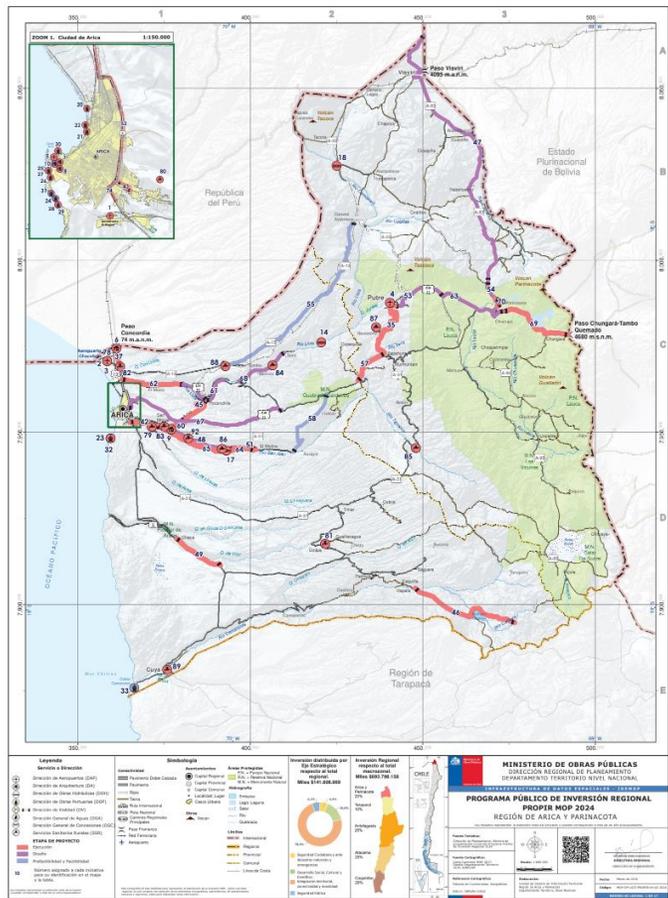

Ministerio de Obras Públicas Dirección de Planeamiento Programa Público de Inversión Regional PROPIR MOP 2024 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

N°	POSICIÓN MAPA	CÓDIGO BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA	MONTO 2024 (\$Miles)
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS					
1	ZOOM 1	40055200-0	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AEREO PARA EMERGENCIAS AERODROMO EL BUITRE	EXECUCIÓN	534.115
2	1C	40039676-0	CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 02-30, AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA	EXECUCIÓN	467.880
3	1C	40056335-0	CONSERVACIÓN PLATAFORMA AVIACION GENERAL SUR AEROPUERTO CHACALLUTA	EXECUCIÓN	320.880
4	2C	40056086-0	CONSERVACIÓN PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICOPTEROS PUTRE HUAMACHICO	EXECUCIÓN	260.978
5	ZOOM 1	40056050-0	CONSERVACIÓN PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICOPTEROS ARICA FUERTO	EXECUCIÓN	206.894
TOTAL SERVICIO:					1.790.547
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA					
6	1C	40053823-0	CONSERVACIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024	EXECUCIÓN	530.400
7	ZOOM 1	40047081-0	CONSERVACIÓN EDIF. MOP- ARICA Y PARINACOTA	EXECUCIÓN	644.500
8	ZOOM 1	40084848-0	CONSERVACIÓN MERCADO CENTRAL DE ARICA	EXECUCIÓN	347.255
9	1C	40047076-0	CONSERVACIÓN CAMPAMENTO LAS RIVERAS OCH ARICA Y PARINACOTA	EXECUCIÓN	137.090
10	ZOOM 1	40029750-0	MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA, ARICA	DISENO	225.847
11	*	40020264-0	ACTUALIZACIÓN INVENTARIO NACIONAL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	EXECUCIÓN	129.162
TOTAL SERVICIO:					2.014.814
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS					
12	*	40057987-0	CONSERVACIÓN GLOBAL DEL CAUCE NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025	EXECUCIÓN	5.653.050
13	*	40047574-0	CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE REGIO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025	EXECUCIÓN	4.318.685
14	2C	30034659-0	CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA	EXECUCIÓN	2.274.644
15	*	40047421-0	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025	EXECUCIÓN	2.157.766
16	*	40057986-0	CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE REGIO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2024	EXECUCIÓN	600.000
17	1D	40031389-0	ANÁLISIS LIMITACIÓN DEL CAUCE DEL RIO SAN JOSE, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	EXECUCIÓN	153.519
18	2B	40020242-0	DIAGNÓSTICO OBRAS MEJORAMIENTO CALIDAD AGUA RIO AZUFRE	EXECUCIÓN	150.735
19	*	40035370-0	CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	EXECUCIÓN	148.982
TOTAL SERVICIO:					15.907.381
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS					
20	ZOOM 1	40008050-0	MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS SACAS	EXECUCIÓN	4.954.281
21	ZOOM 1	40046188-0	MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO ETAPA 1, COMUNA ARICA	EXECUCIÓN	1.368.389
22	ZOOM 1	40060121-0	PROYECCIÓN MUELLES BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO	EXECUCIÓN	670.420
23	1D	40049426-0	CONSERVACIÓN BORDE COSTERO SECTOR CUEVAS DE ANZOTA	EXECUCIÓN	487.248
24	ZOOM 1	40046150-0	MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA ARENILLAS NEGRAS ARICA 2DA EDICIÓN	DISENO	454.093
25	ZOOM 1	40020235-0	MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR EX ISLA DEL ALCAZAR (ETAPA 3 Y 6)	DISENO	276.762
26	ZOOM 1	40056330-0	CONSERVACIÓN PROTECCIÓN COSTERA SECTOR INFERNILLO 2	EXECUCIÓN	218.144
27	ZOOM 1	40060338-0	CONSERVACIÓN BORDE COSTERO ALCAZÁN	EXECUCIÓN	201.000
28	ZOOM 1	30059793-0	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RECALCIFICACIÓN CALETA PESQUERA ARICA	DISENO	89.264
29	ZOOM 1	40049585-0	DIAGNÓSTICO CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA SECTORES ARENILLAS NEGRAS Y DUJANI	EXECUCIÓN	64.385
30	ZOOM 1	30195622-0	CONSERVACIÓN SITIO 7 FUERTO DE ARICA	EXECUCIÓN	7.600
31	ZOOM 1	40059196-0	MEJORAMIENTO INTEGRAL BORDE COSTERO SU8	DISENO	3.010
32	1D	40020240-0	DIAGNÓSTICO RIESGO GEOLÓGICO Y MITIGACIÓN EN CUEVAS DE ANZOTA	EXECUCIÓN	10
33	1E	40020231-0	MEJORAMIENTO CALETA PROSPEA CAMARONES	FACTIBILIDAD	10
TOTAL SERVICIO:					8.825.126
DIRECCIÓN DE VIALIDAD					
34	*	40043720-0	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024	EXECUCIÓN	20.731.299
35	2C	30239372-0	REPOSICIÓN RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO, ZAPAHLIRA PUTRE (VM 100 -127)	EXECUCIÓN	15.638.983
36	*	40038474-0	CONSERVACIÓN RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024	EXECUCIÓN	15.516.416
37	1C	30459383-0	AMPLIACIÓN RUTA 5, SECTOR: BUFRACACION AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA	EXECUCIÓN	11.906.264
38	*	40054740-0	CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 - 2024 XV REGIÓN	EXECUCIÓN	6.303.820
39	*	40010935-0	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020	EXECUCIÓN	5.101.793
40	*	40038462-0	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027	EXECUCIÓN	4.075.040



Link Dossier Nacional Programa Público de Inversión Regional PROPIR MOP 2024
Pinchar en cada Región para desplegar mapa y cartera



Visor de Proyectos Programa Público de Inversión Regional PROPIR MOP 2024.
Ministerio de Obras Públicas- Dirección de Planeamiento



Visor de Contratos de Obras MOP.
Ministerio de Obras Públicas- Dirección General de Obras Públicas

AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – MARZO 2024

Información al cierre de marzo 2024

Incluye INH y SISS

Cifras en Millones de \$

EJECUCIÓN GENERAL

4.819.315

Presupuesto
Vigente Neto

1.073.233

Ejecución Presupuestaria
Acumulada

22,3%

Porcentaje Ejecución
Presupuestaria

2024

16,2%

Porcentaje Ejecución
Presupuestaria

2023

 **+6,1%**
variación respecto al
mismo mes del año
anterior

EJECUCIÓN ST 31 INVERSIÓN

3.657.809

Presupuesto
Vigente Neto

436.990

Ejecución Presupuestaria
Acumulada

11,9%

Porcentaje Ejecución
ST 31

2024



8,2%

Porcentaje Ejecución
ST 31


2023

 **+3,7%**
variación respecto al
mismo mes del año
anterior

EJECUCIÓN A CIERRE DE MARZO DE REGIONES DE LA MACROZONA NORTE — MACROZONA CENTRO

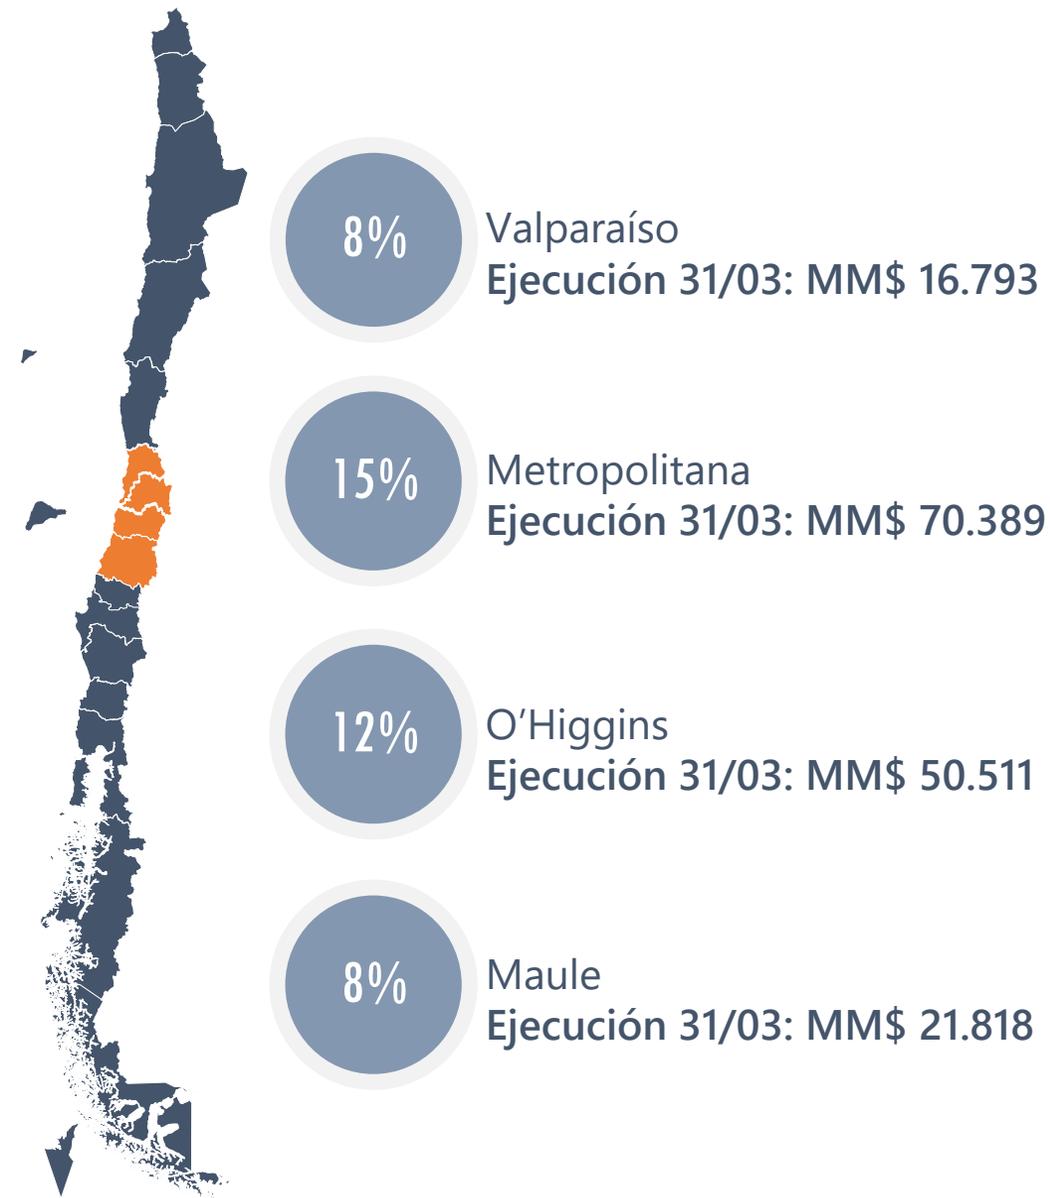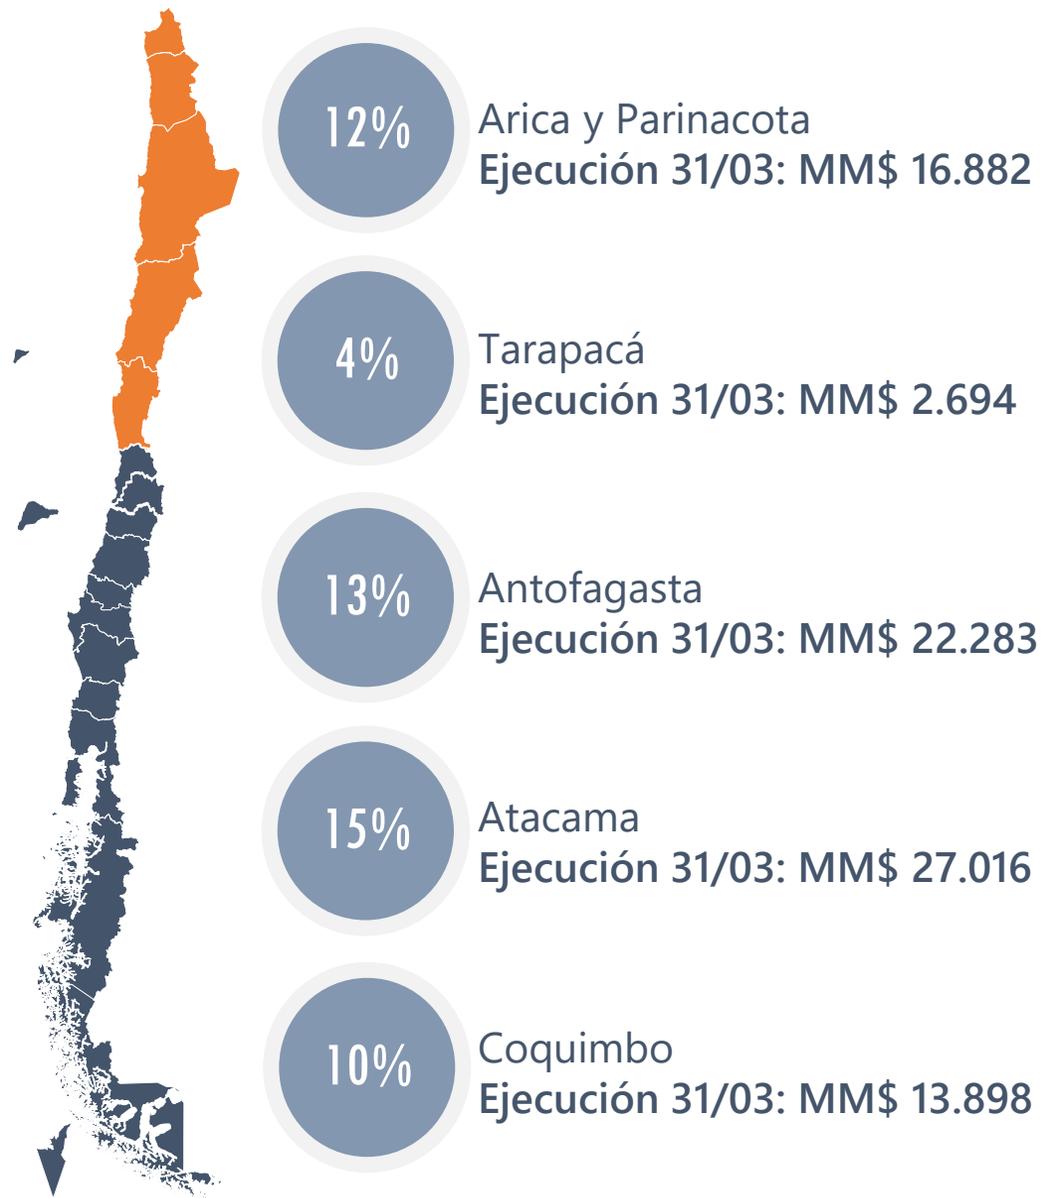

EJECUCIÓN A CIERRE DE MARZO DE REGIONES DE LA MACROZONA SUR — MACROZONA AUSTRAL

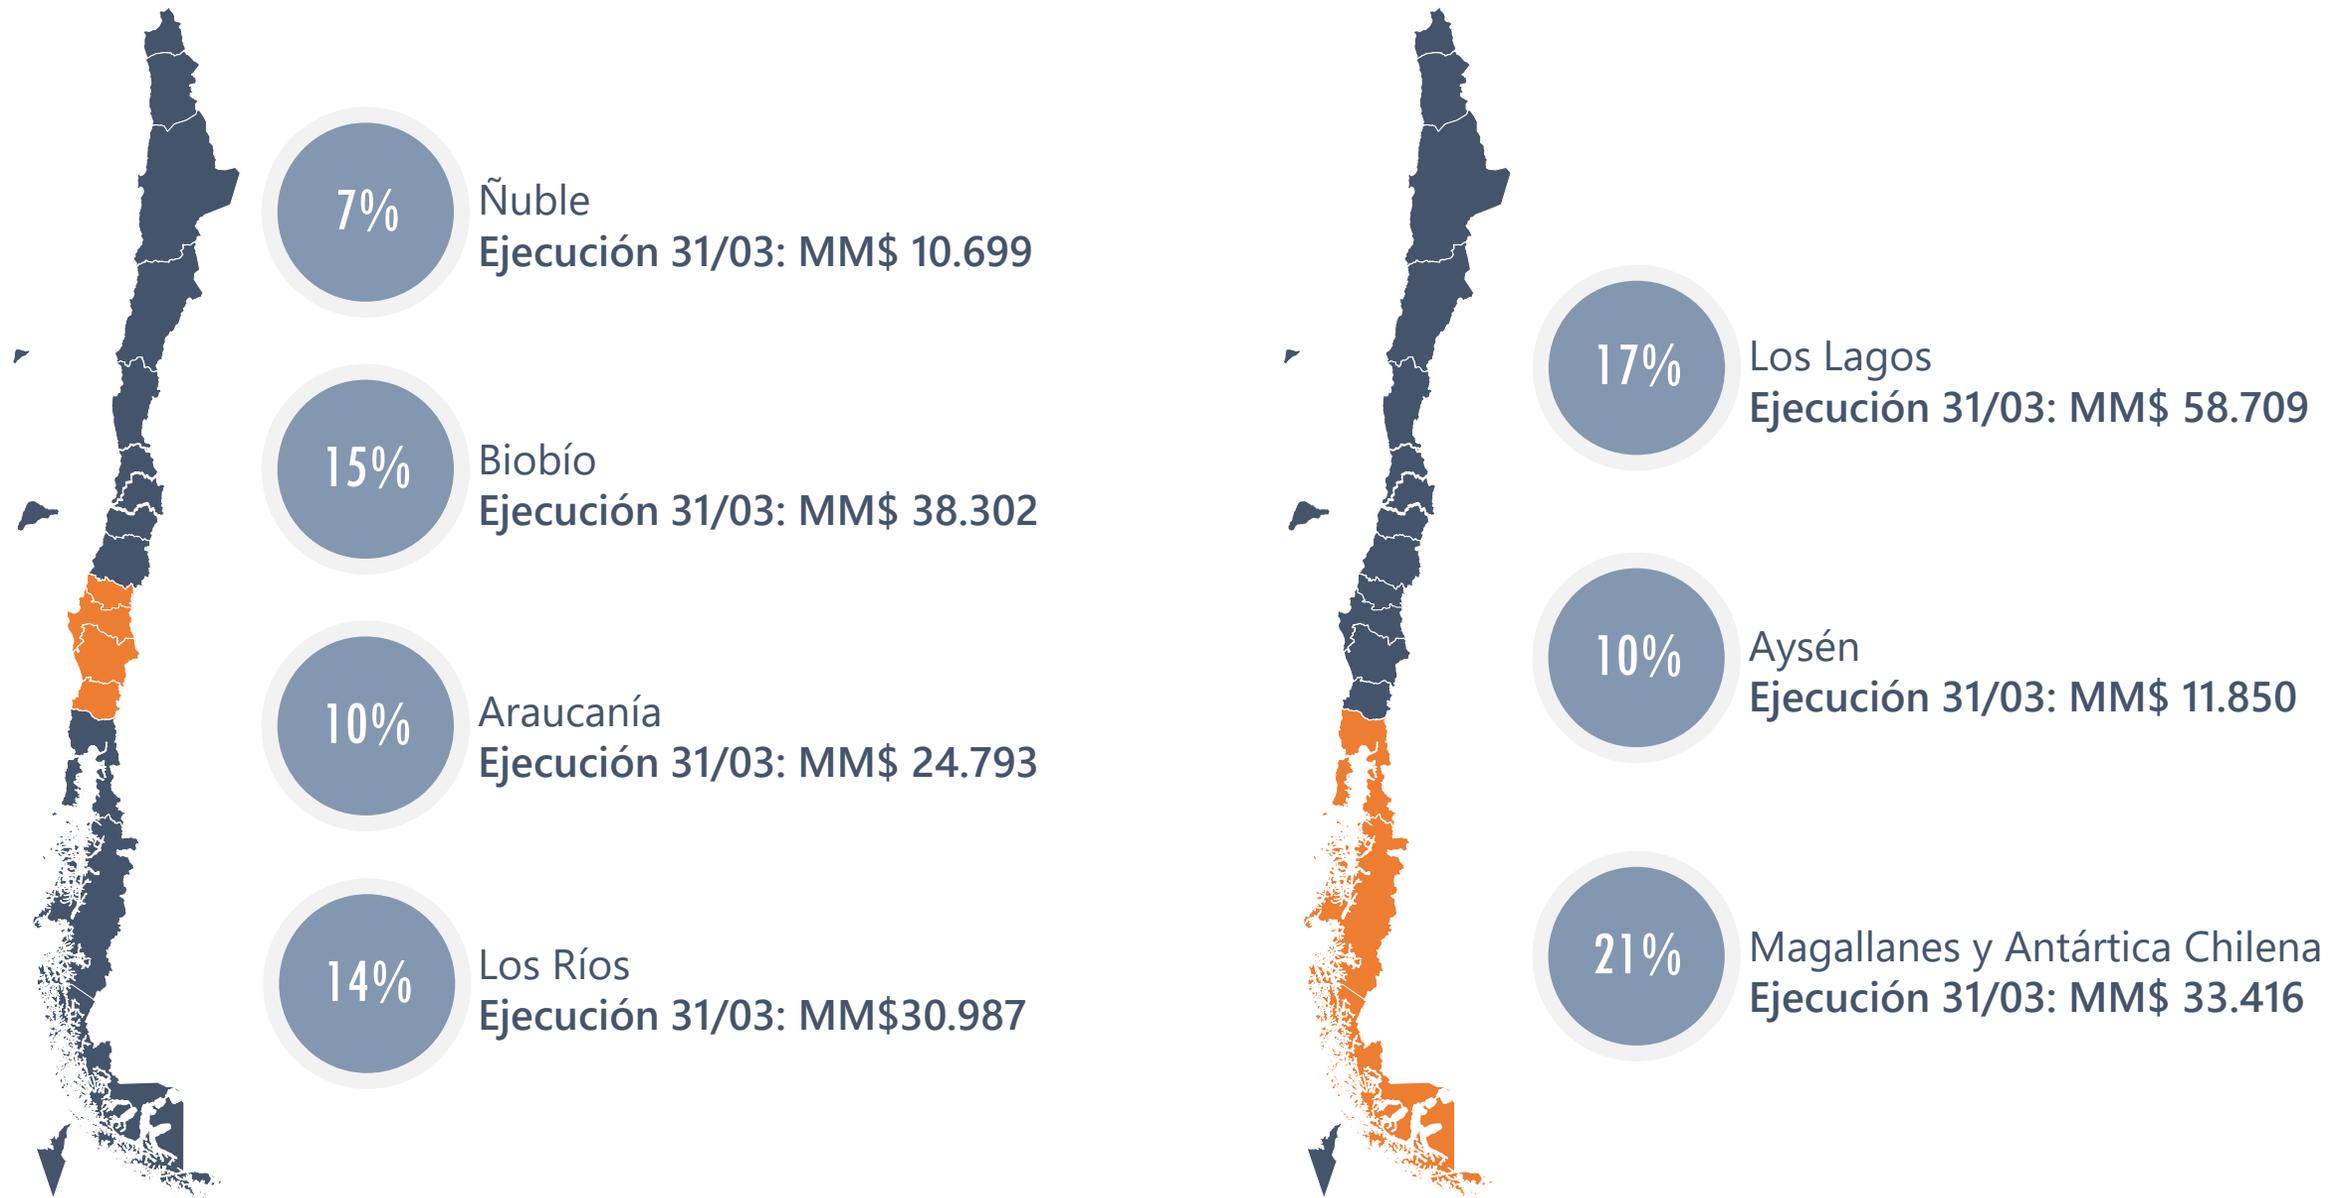

PROYECTOS PROGRAMADOS POR EJE ESTRATÉGICO DE LA LEY DE PRESUPUESTOS MOP 2024

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y CONECTIVIDAD

Vialidad

1.750 km

Programa de Mejoramiento de Caminos Rurales
MM\$ 275.000.

140 km

Carretera Austral: Cartera de 16 Proyectos de la Ruta 7 en Palena y Aysén, en etapa de ejecución. (Obras en ejecución 2024)

Obras Portuarias

4 Naves

Conectividad lacustre austral: en lagos General Carrera y O'Higgins (Aysén) y 2 en lago Ranco (Los Ríos).

Aeropuertos

16 Aeropuertos y
aeródromos

100% de la Red Primaria intervenida en 2024
MM\$ 138.000.

PROYECTOS PROGRAMADOS POR EJE ESTRATÉGICO DE LA LEY DE PRESUPUESTOS MOP 2024

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

SEGURIDAD HÍDRICA

Propuesta
legislativa

Ley N°21.639 que habilita la ejecución de infraestructura hídrica multipropósito

Dirección General
de Aguas

10 Mesas
hídricas Planes estratégicos de
Recursos Hídricos
(Código de Agua)

94 Nuevas
Estaciones Estaciones de medición y monitoreo del
recurso hídrico, se aumentan a 2.062

Infraestructura
hídrica

2 Embalses
en obra Obras en construcción:
Las Palmas, 2.932 ha. (DGC)
Empedrado, 273 ha. (DOH)

11 Plan de
Embalses

- En procesos de licitación Nueva La Punilla (42.100 ha. por DGC) y Zapallar, por DOH; y 10 en etapa de estudio
- Plan Nacional de telemetría de embalses

1 Desaladora
para SSR en Quilimarí, Los Vilos

Servicios
Sanitarios
Rurales

25 Nuevos sistemas semiconcentrados :
4.000 arranques nuevos que benefician
a 12.000 habitantes

30 Sistemas de ampliados y mejorados:
9.000 arranques que benefician a 28.000
habitantes

PROYECTOS PROGRAMADOS POR EJE ESTRATÉGICO DE LA LEY DE PRESUPUESTOS MOP 2024

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, PRODUCTIVO Y CIENTÍFICO

Vialidad

100

Intervenciones
en Escuelas

Programa de seguridad vial en zonas escolares rurales

Obras Portuarias

17

Plan Caletas
Pesqueras

5 terminadas en 2023, 7 en ejecución, 1 por licitar y 4 en
diseño en 2024



Proyecto de caleta pesquera en Chañaral de Aceituno

PROYECTOS PROGRAMADOS POR EJE ESTRATÉGICO DE LA LEY DE PRESUPUESTOS MOP 2024

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, PRODUCTIVO Y CIENTÍFICO

Plan Buen Vivir

195

Proyectos

Iniciativas del Plan Buen Vivir / Regiones Biobío a Los Lagos

Comprende obras de todos los Servicios MOP en forma coordinada

Concesiones

16

Contratos de
Concesión

Plan Buen Vecino en carreteras concesionadas

20 pasarelas, 6 áreas de servicio, plazas y espacios públicos y facilidades peatonales, 15 obras de seguridad e iluminación, 17 mil metros de pantallas acústicas, 60 kilómetros de calles de servicio



Servicio Sanitario Rural en Choroico, Cunco (Región de La Araucanía)



Plaza Primo de Rivera, Maipú / Dirección General de Concesiones

PROYECTOS PROGRAMADOS POR EJE ESTRATÉGICO DE LA LEY DE PRESUPUESTOS MOP 2024

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, PRODUCTIVO Y CIENTÍFICO

Edificación Pública

22

Iniciativas
mandatadas

Infraestructura de salud

para atención especializada y primaria

- Dirección de Arquitectura: En atención primaria se avanzará en 19 iniciativas, y se terminarán durante la administración 3 laboratorios ambientales y laborales.
- Atención especializada: 5 hospitales (Concesiones y Dirección de Arquitectura)

5

hospitales



36

Iniciativas
mandatadas

Infraestructura de educación básica y media

Dirección de Arquitectura: Se licitará el Plan de Contingencia del Liceo Frei Montalva de Monte Patria y durante esta administración se terminará la Escuela San Antonio de Barraza en Coquimbo y la Escuela Fronteriza Monte Patria, entre otros. Además esta dirección se encuentra colaborando en los aspectos técnicos de la reposición de la Escuela Insular Robinson-Crusoe para su próxima licitación del anteproyecto



PROYECTOS PROGRAMADOS POR EJE ESTRATÉGICO DE LA LEY DE PRESUPUESTOS MOP 2024

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

SEGURIDAD CIUDADANA Y ANTE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS

Obras
Portuarias

16 Km

28 proyectos de defensas en Bordes Costeros:
19 obras finalizan (11.675 m lineales) y 9 se inician (4.445 m lineales), para protección y espacio público seguro

Aeropuertos

43 Puntos

Plan de Puntos de posadas de helicópteros
respecto a un total de 103 puntos del Plan



Proyecto en ejecución Borde Costero Curanipe, Región del Maule



Punto de Posada en Arica

PROYECTOS PROGRAMADOS POR EJE ESTRATÉGICO DE LA LEY DE PRESUPUESTOS MOP 2024

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

SEGURIDAD CIUDADANA Y ANTE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS

Concesiones

Autopistas
112

Cámaras CCTV
normales y térmicas

1.029
74

Luminarias Dobles

Lectores de Patente

1

Centro Penitenciario Laguna Talca: adjudicación contrato de habilitación y operación

INVERSIÓN EXTRA SECTORIAL

Arquitectura

12

Iniciativas

Justicia: Se espera 70% avance Nuevo Edificio Central del Servicio Médico Legal (43% de avance físico al 8 de abril), y terminar el diseño de la cárcel de Calama.

22

Iniciativas

Bomberos: 12 iniciativas en ejecución; 5 en licitación; 5 terminados en la administración, destacando el Cuartel de Bombreros de Placilla y Navidad en la región de O'Higgins, la 3era Compañía de Puerto Dominguez, La brigada Fundo El Carmen en la región de La Araucanía


91

Iniciativas

65 iniciativas de Carabineros y 25 de PDI (Obras y Diseños) 27 en proceso de licitación; 34 en ejecución; 21 terminados y 9 en otros estados



DISTRIBUCIÓN DE OBRAS PARALIZADAS POR REGIÓN

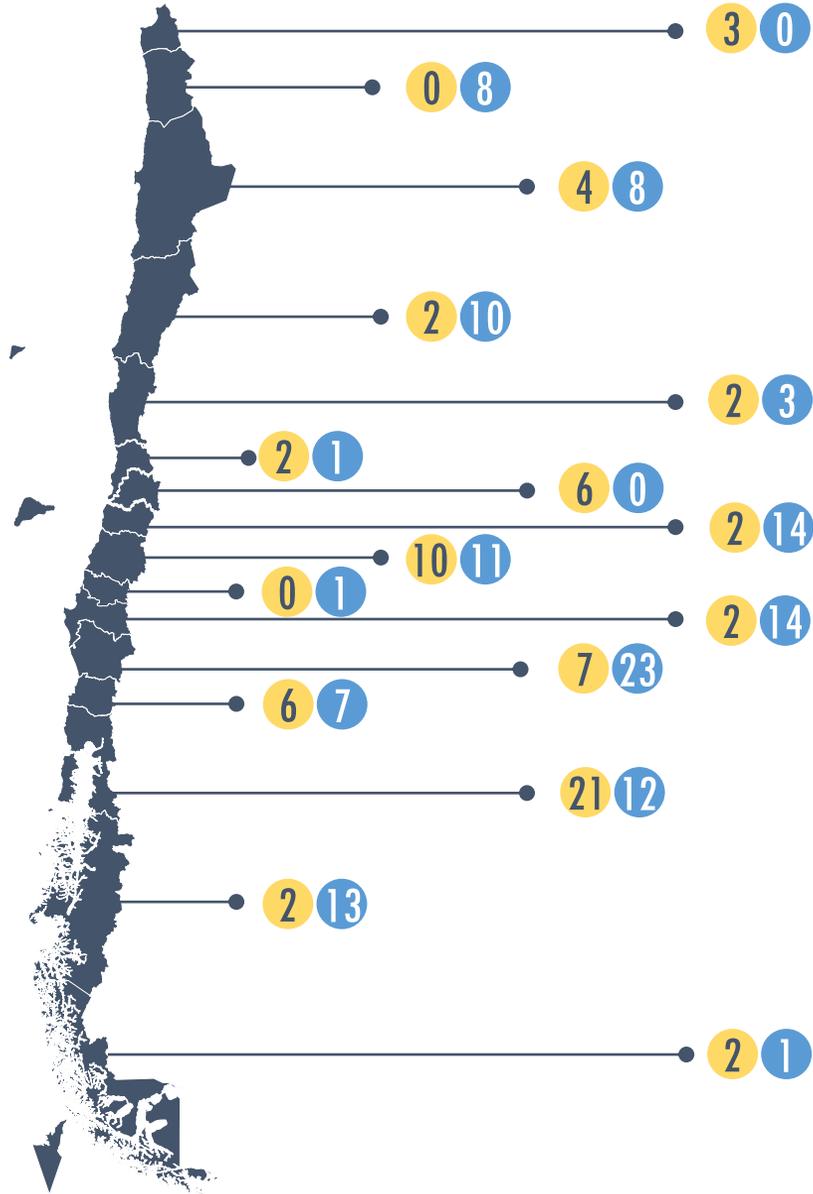

REGIÓN	SERVICIO	# CONTRATOS	ESTADO ACTUAL
Arica y Parinacota	ARQUITECTURA	2	
	VIALIDAD	1	
Tarapacá	ARQUITECTURA	1	
	VIALIDAD	7	
Antofagasta	ARQUITECTURA	4	
	VIALIDAD	7	
	SSSR	1	
Atacama	ARQUITECTURA	2	
	VIALIDAD	9	
	DOH	1	
Coquímbo	ARQUITECTURA	2	
	DOP	1	
	ARQUITECTURA	1	
Valparaíso	ARQUITECTURA	2	
	ARQUITECTURA	6	
RM	ARQUITECTURA	2	
	ARQUITECTURA	2	
O'Higgins	VIALIDAD	8	
	SSSR	4	
	VIALIDAD	1	
Ñuble	ARQUITECTURA	1	
	VIALIDAD	8	
Maule	VIALIDAD	11	
	SSSR	1	
	ARQUITECTURA	2	
Bióbio	VIALIDAD	12	
	SSSR	1	
	DOP	1	
	ARQUITECTURA	2	
Araucanía	ARQUITECTURA	2	
	VIALIDAD	15	
	SSSR	5	
	SSSR	4	
	SSSR	1	
Los Ríos	DOH	1	
	ARQUITECTURA	5	
	VIALIDAD	7	
Los Lagos	VIALIDAD	1	
	ARQUITECTURA	1	
	VIALIDAD	2	
	VIALIDAD	11	
Aysén	VIALIDAD	4	
	SSSR	15	
	DAP	1	
Magallanes	ARQUITECTURA	2	
	VIALIDAD	12	
Magallanes	ARQUITECTURA	1	
	VIALIDAD	1	
Total		197	

PROGRAMA BUEN VIVIR

Objetivo 2024 del Programa Infraestructura para el Buen Vivir (PIBV): dotar de adecuada cobertura, disponibilidad y acceso a servicios de infraestructura a las comunidades indígenas y rurales de las provincias de Arauco y Biobío en la Región del Biobío y la Región de la Araucanía, además de Los Ríos y Los Lagos a partir de este año.

Principales logros durante el primer trimestre:

406

Contratos
de obras

53

Obras
Terminadas

106

Km
Terminados

- A la fecha se han terminado 53 obras, de las cuales 26 corresponden a la Araucanía, 25 al Biobío y 2 a la región de Los Ríos.
- Algunos proyectos destacados son:
 - Mejoramiento Ruta Q-30, La Mona-Alamo Huacho, Los Ángeles
 - Reposición Puente Laraquete. Comuna de Arauco, Provincia de Arauco
 - Construcción Sistema APR Puente Basa Grande, Curarrehue
- 106 Km terminados de conservación y mejoramiento de caminos en **comunidades indígenas** y rurales de La Araucanía. Proyección al final del periodo 2024 es de 432 km finalizados.
- Inicio de obras del puente Chichintawe en Alto Biobío, proyecto emblemático de restitución de conectividad bajo compromiso presidencial
- **Se constituyó en marzo 2024 el PIBV en la Región de Los Lagos**, designando coordinador birregional a Pablo Ojeda P. ingeniero constructor de vasta experiencia en infraestructura.
- Se dispone de cartera 2024 por MM\$ 49.000 para Los Lagos, lo que supera en 90% el presupuesto inicialmente identificado (MM\$ 25.740) en Res. DGOP 109 de enero 2024. Comprende proyectos viales y de SSR.
- Se generó en marzo 2024 primera instancia de coordinación con equipo regional PBV Segpres (coordinador regional Cristian Caipillan, coordinador Prov. Osorno Elías Huaiquilén



Inicio de obras Puente Chichintawe

CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS

Camino en Comunidades Indígenas (CCI)

CCI comprometidos ejecutar año 2024

Región	Nº Contratos	Kilómetros Comprometidos por Modalidad		
		CT	CG	AD
Biobío	9	30		
Araucanía	10	90		160
Los Ríos	8	53	45	
Los Lagos	10	51	31	
Total	37	224	76	160
		460		

CT Contrato Tradicional
CG Contrato Global
AD Administración Directa

CCI Avance al 31 de marzo de 2024

Kilómetros Avance al 31 de marzo		
CT	CG	AD
4,6		
4,1		3,5
0,9		
13,4	10	
23,0	10,0	3,5
36,5		

PLAN DE ACCIÓN MOP

GESTIÓN MINISTERIAL PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN



PLAN DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

GESTIÓN CONTRACTUAL Y CAMBIOS NORMATIVOS

CAMBIOS NORMATIVOS

ACTUALIZACIÓN PROGRESIVA
DEL DS75 Y DS48

OBJETIVOS

Acelerar la ejecución de contratos y brindar mayor liquidez a los contratistas.

Propiciar aumento de oferentes en licitaciones.

Reducir tiempo de trámite de licitaciones públicas, tratos directos y sus modificaciones.

Permitir la intervención temprana del MOP en las obras abandonadas.

1 Posibilitar la Ejecución inmediata de modificaciones de contrato

2 Habilitar la inscripción en el registro MOP de empresas relacionadas

3 Permitir la conformación de consorcios para complementar capacidad económica

4 Regular el reemplazo de la garantía de anticipo a medida que se restituya el monto

5 Establecer un nuevo anticipo para la contratación de partidas proforma.

6 Posibilitar que el MOP intervenga en obras terminadas anticipadamente

- DS 177, de 2022, Reajuste Polinómico Transitorio
- DS 147, de 2023, Medidas Transitorias Pro Pyme
- DS 156, de 2023, Medidas Permanentes referidas a Consorcios, OEI y Garantías

PLAN DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

GESTIÓN CONTRACTUAL Y CAMBIOS NORMATIVOS

Ámbitos de acción :

- **Reactivación económica y productividad (Pyme)**
- **Mejoras en la gestión**
- **Apoyar el financiamiento a las empresas de la construcción**

- 1 DS 177, de 2022, Reajuste Polinómico Transitorio
- 2 DS 147, de 2023, Medidas Transitorias Pro Pyme
- 3 DS 156, de 2023, Medidas Permanentes referidas a Consorcios, OEI y Garantías

*Solo cambios normativos, no se incluyen cambios en Gestión Contractual Interna, ni Medidas de Apoyo al Financiamiento de las empresas (ej. Confirming) que no sean normativas.

PLAN DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

GESTIÓN CONTRACTUAL Y CAMBIOS NORMATIVOS

1

DECRETO MOP 177 DE 2022 REAJUSTE TRANSITORIO

IMPLEMENTACIÓN AJUSTE RETROACTIVO

REAJUSTE EXCEPCIONAL

Permite reajustar retroactivamente estados de pago desde el 1° de sept. de 2021, hasta que finalice el contrato o se alcance, un máximo del 20% del valor del contrato adjudicado.

- **ESTA MISMA MEDIDA SE IMPLEMENTÓ, EL 15 DE FEBRERO DE 2023**, en los contratos que el MOP ejecuta a través de las empresas sanitarias.
- **MEDIDA VIGENTE AGOSTO 2023**

CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS

614 CONTRATOS
204 EMPRESAS



123 MIL MILLONES
DE PESOS

2

DECRETO MOP 147 DE 2023 MEDIDAS TRANSITORIAS (2023 – 2024) PRO PYME

- En lo vinculado a **subcontratación**, esta materia se ha abordado de manera transitoria en el RCOP, ello a través del artículo 15 transitorio, que faculta para el presente año 2024, para que en las licitaciones se contemple un aumento del porcentaje de subcontratación, de un 30% hasta un 50% del monto del contrato.
- **Habilitar a contratistas de obras menores para que postulen a contratos de obra de hasta 20.000 UTM** (límite anterior 6.000 UTM). La cantidad de contratos en los cuales podrán ofertar los contratistas de obra menor aumentará en un 60%, generándose mayor competencia en estos mercados, favoreciendo, de paso, a pequeñas y medianas empresas contratistas.

PLAN DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

GESTIÓN CONTRACTUAL Y CAMBIOS NORMATIVOS

3

DECRETO MOP 156

EL DS MOP N° 156 DE 2023, QUE MODIFICA EL D.S. 75 MOP DE 2004:

- Posibilitar la conformación de Consorcios, siempre para complementar capacidad económica y no solo para suplementar especialidades.
- Permitir la inscripción en el registro MOP de empresas relacionadas, las que se encontrarán imposibilitadas de ofertar separadamente en una misma licitación. (recomendación normativa TDLC)
- Permite a los contratistas a solicitar anticipos por los Valores Proforma
- Posibilitar la ejecución inmediata de modificaciones de contrato cuando sea indispensable para la continuidad de las obras o las demoras en su tramitación supongan la paralización total o parcial de éstas.
- Regular el reemplazo de la garantía de anticipo a medida que se restituya el monto adelantado y la posibilidad de devolver la garantía una vez amortizado totalmente éste.

PLAN DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

GESTIÓN CONTRACTUAL Y CAMBIOS NORMATIVOS

PAGO REAJUSTE EXCEPCIONAL RETROACTIVO

DS MOP N° 177 DE 11/NOV/2022

ACUMULADO 2022 - 2024

1.738
OPERACIONES

239
CONTRATISTAS

MM\$ 151.256

BANCO ESTADO

LÍNEA DE CRÉDITO:

- Tasa de interés 0.89 % mensual.
- Uso de las garantías estatales como: Fogaes, Fogape, Fogape Chile Apoya y Fogain.

CONFIRMING

PÓLIZAS:

- Con formatos tipos para la ejecución de obras.
- Seguro para maquinaria de construcción.

EJECUTIVOS ESPECIALISTAS EN OOPP:



- Desafío sumar a toda la banca en buscar soluciones en conjunto para la industria.

ASOCIACIÓN DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

- Sumar a toda la banca en el desafío de buscar soluciones en conjunto para la industria.
- Avanzar en el confirming.
- Acelerar el proceso de certificación de garantías
- Diálogo en torno al riesgos de las OOPP

SITIO WEB PLAN DE LICITACIONES 2024 MERCADO PÚBLICO

GESTIÓN MINISTERIAL PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN



<https://www.mop.gob.cl/visordelicitaciones/>

PROGRAMACIÓN DE PRINCIPALES LICITACIONES 2024 POR SERVICIO SECTORIAL

PRIMER PAQUETE DE MEDIDAS DE GESTIÓN MINISTERIAL PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN



ARQUITECTURA

102


M\$ 309.516.492



OBRAS HIDRÁULICAS

65

M\$ 120.485.927



SERVICIO
SANITARIO RURALES

111

M\$ 183.365.493



OBRAS PORTUARIAS

49


M\$ 97.700.706



AERPUERTOS

67

M\$ 132.750.410



VIALIDAD

291

M\$ 1.413.737.796

685
LICITACIONES

M\$ 2.273.077.058

CUMPLIMIENTO E INFORMES DE AVANCE DE GLOSAS Y ARTICULADO LEY DE PRESUPUESTOS 2024

RESUMEN

1

Tenemos más de 2.200 proyectos de inversión a lo largo de Chile, con más de 4.400 contratos asociados en todos los ejes estratégicos

2

Tenemos más de 3,84 billones de pesos en proyectos de inversión sectorial y extrasectorial a nivel nacional.

3

Al mes de marzo tenemos un aumento de 4 puntos porcentuales en la ejecución presupuestaria respecto al año 2023.

4

Al día de hoy tenemos el 98% del presupuesto identificado de la cartera de proyectos, proyectando un 41% de ejecución al mes de junio y un 100% a diciembre.

5

Se ha cumplido el 100% en la atención y recuperación de emergencia y ayuda temprana de infraestructura año 2023 y se continúa en los compromisos año 2024.

6

Contamos con un robusto plan estratégico de implementación, seguimiento y control de la inversión de las obras públicas.





JESSICA LÓPEZ SAFFIE
Ministra de Obras Públicas
