Gobierno Regional
Región de Atacama

Gobierno de Chile

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

Plan de Reconstrucción de Atacama 2015-2020

Francisco Sánchez Barrera
Intendente de la Región de Atacama
Gobierno Regional de Atacama

Santiago, 03 de Septiembre de 2018

CONTENIDOS

- Introducción
- Presupuesto
- Historia
- Identificación Responsabilidades y Directorio
- Flujograma de la Información
- Modificaciones
- Cartera Definitiva
- Avances
- Resumen Proyectado por Sector

Reasignación Presupuestaria

Intendencia Región de Atacama
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

CERTIFICADO

Los funcionarios del Departamento de Administración y Finanzas que suscriben, certifican e informan al Sr. intendente de la Región de Atacama, Don Francisco Sánchez Barrera, que este Servicio no ha sido receptor, intermediario, o mandatario para la tenencia, ejecución, o administración, de recursos relacionados a una cifra de US$ 500.000.000.- (Quinientos millones de dólares), o su equivalente en pesos chilenos, ni de otra cifra en moneda de igual denominación extranjera, durante los períodos que abarcan desde el año 2015 a la fecha.

Este Servicio, solo ha recepcionado para su funcionamiento y el pago de servicios a terceros, recursos denominados en moneda nacional.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

INTENDENCIA DE ATACAMA COPIAPÓ CHILE

DORIS ESCOBAR FLORES
ENCARGADA DE PRESUPUESTOS

GUILLERMO LOPEZ GONZALEZ
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS
INTENDENCIA REGIONAL DE ATACAMA

COPIAPO, 28 de Agosto de 2018

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
DEPTO. PRESUPUESTO

CERTIFICADO

LUZ MARGARITA CABELLO TABILO y **JOSE ROBERTO GONZALEZ CARCAMO**, en sus calidades de Jefa de la División de Administración y Finanzas y Jefe del Depto. de Presupuesto, respectivamente, del Gobierno Regional de Atacama, certifican que durante los años 2016-2017 y 2018 se incorporó recursos por concepto de "Recuperación de Daños por Catastofe", de acuerdo a Anexo, dentro del Presupuesto del Prog. 02 inversión regional, no teniéndose ninguna información que estos sean parte de los U$ 500 millones ofrecidos post aluvión del año 2015.

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA DEPTO. PRESUPUESTO

JOSE GONZALEZ CARCAMO
JEFE DEPTO. PRESUPUESTO

REPÚBLICA DE CHILE GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

LUZ CABELLO TABILO
JEFA DIV. ADM. Y FINANZAS

Copiapó, 28 de agosto de 2018

Reasignación Presupuestaria

ANEXO

PROV. RECUPERACION DE DAÑOS

AÑO	LEY PRESUPUESTO (M$)	REC.DAÑOS (M$
2015	45.334.900	No Incorpora
2016	58.015.729	8.980.022
2017	59.738.053	10.332.478
2018	59.742.273	14.618.849

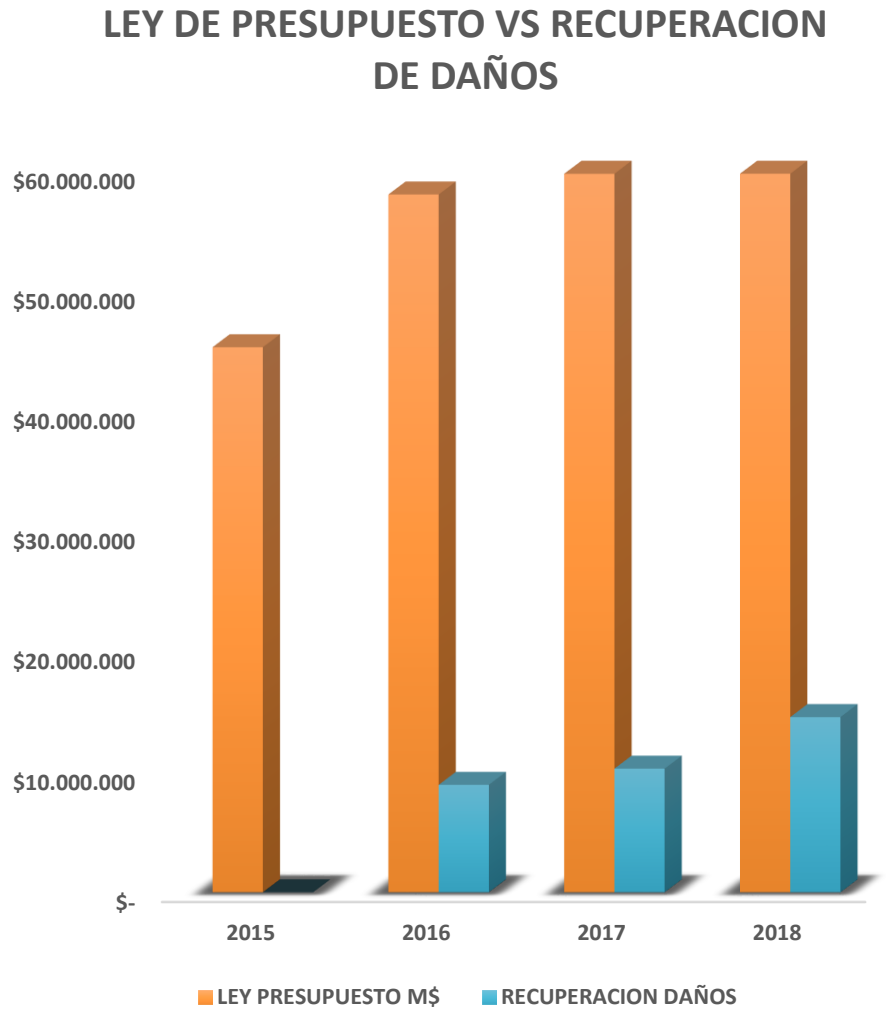

Historia Plan de Reconstrucción Atacama

Dirección de Presupuestos
Gobierno de Chile

Reg. N° 225/BB
09.09.2015

2538

ORD. N° 2354 /

ANT.: No hay.

MAT.: Programa de Emergencia, Rehabilitación y Reconstrucción de la Región de Atacama 2015-2020.

SANTIAGO, 11 SEP 2015

DE : MINISTRO DE HACIENDA

A : SR. MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

En relación a lo señalado en la materia, informo a UD. que, sobre la base del Documento "Juntos por Atacama. Por una mejor región" presentado por la Intendencia de la 3ª Región, la Dirección de Presupuestos efectuó una revisión detallada de los proyectos allí contenidos, en coordinación con los Ministerios involucrados, dando origen al documento "Programa de Emergencia, Rehabilitación y Reconstrucción de la Región de Atacama 2015-2020, el cual se adjunta al presente oficio.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

REPÚBLICA DE CHILE MINISTRO MINISTERIO DE HACIENDA

SUB DIRECTOR DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Ministerio de Hacienda

DIRECTOR DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Ministerio de Hacienda

RODRIGO VALDÉS PULIDO
MINISTRO DE HACIENDA

DISTRIBUCIÓN
- Ministro del Interior y Seguridad Pública
- Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo
- Subdirección de Presupuestos
- Oficina Partes, DIPRES

08047/2015

MINISTERIO DEL INTERIOR SUBDERE 11 SEP 2015 OFICINA DE PARTES

- Costo Total Estimado $ 900 mil Millones, Equivalente a US$ 1.500 millones (valor US$ 600).
- US$ 500 millones de la ley reservada del Cobre.
- US$ 1.000 de presupuestos futuros (reasignaciones).
- Plan de Reconstrucción de Atacama
  - 96 iniciativas.
  - Costo Total M$ 355.914.536.

Identificación Responsabilidades y Directorio

En la actualidad la Secretaria técnica es la Unidad Regional SUBDERE de Atacama(1), recopila la Información del Gasto efectuado por cada Ministerio, convoca las reuniones de Directorio e informa de los avances y modificaciones realizadas al plan de Reconstrucción.

El Directorio de Reconstrucción lo conforman las siguientes autoridades:

- INTENDENTE
- ENCARGADO URS ATACAMA
- JEFE DIPLADE
- SEREMI MOP
- SEREMI MINVU
- SEREMI ENERGIA
- SEREMI MTT
- SEREMI ECONOMIA
- DIRECTOR CORFO
- GOBERNADOR DE HUASCO
- GOBERNADOR DE COPIAPO
- GOBERNADOR DE CHAÑARAL
- CORE PROVINCIA DE HUASCO
- CORE PROVINCIA DE COPIAPÓ
- CORE PROVINCIA DE CHAÑARAL

(1) Según Procedimiento de DIPRES para informar al Congreso Nacional por Cumplimiento de Ley 20.833

Flujograma de información (1)

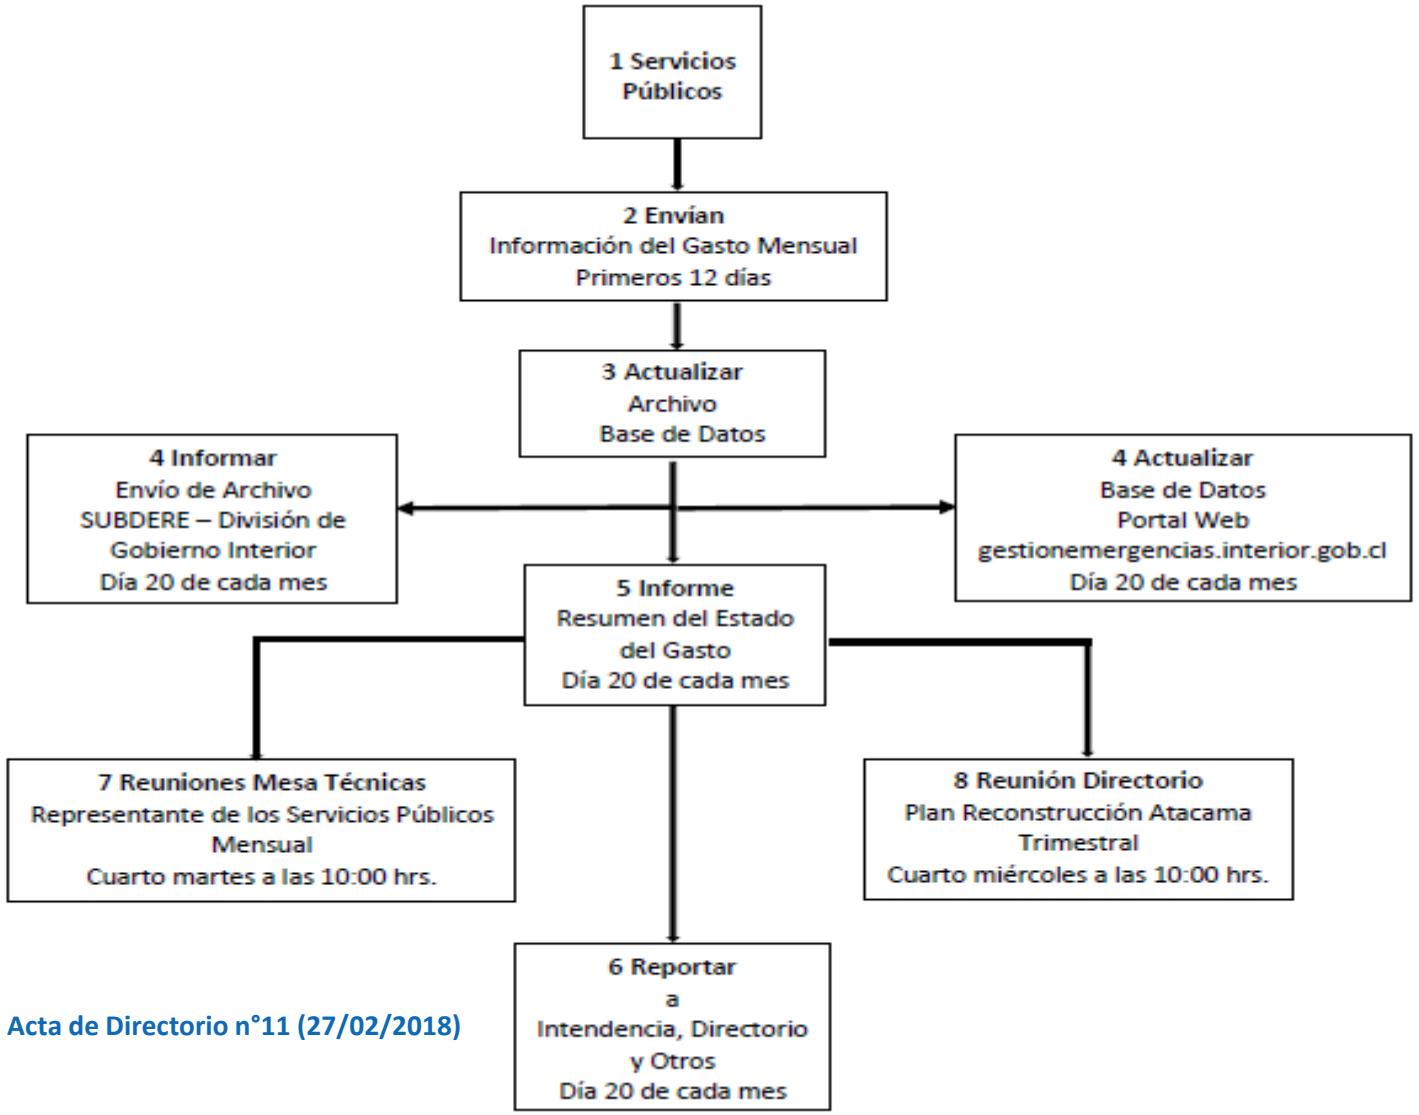

(1) Procedimiento establecido en Acta de Directorio n°11 (27/02/2018)

Modificaciones Plan Reconstrucción Atacama

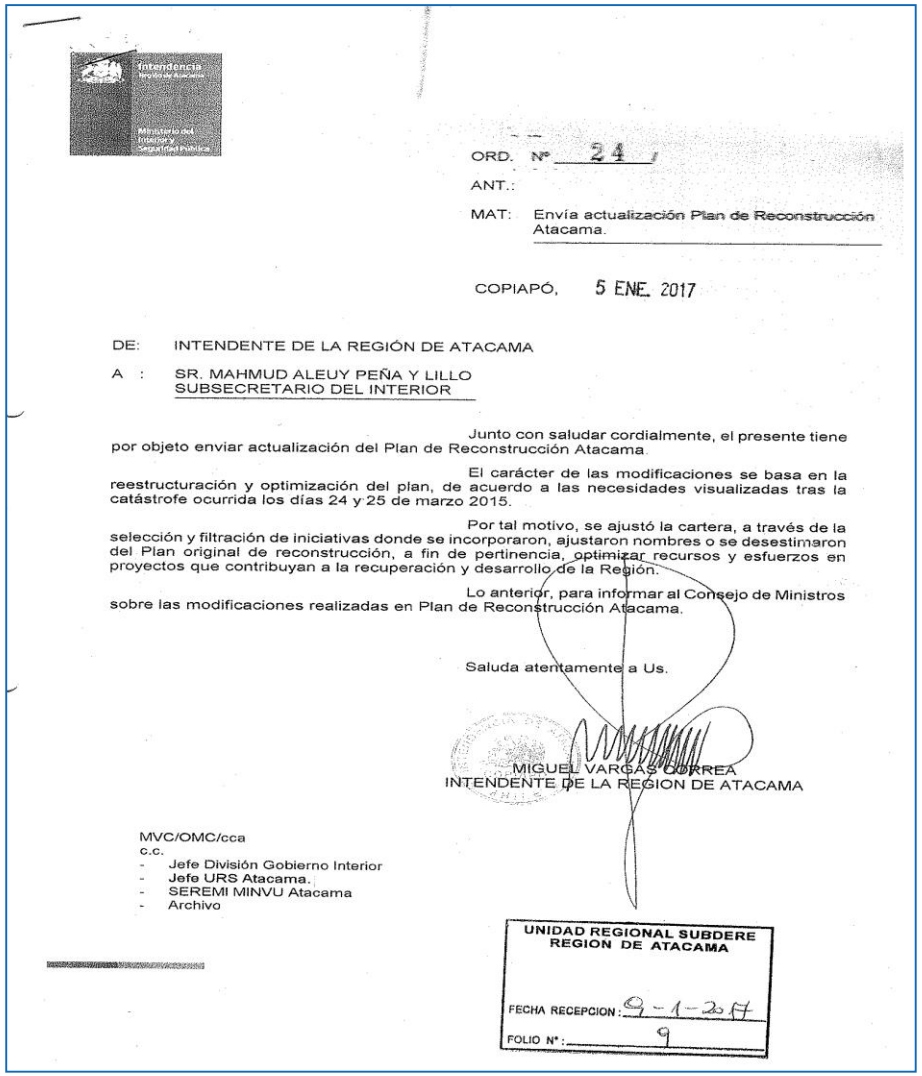

Intendencia
Región de Atacama
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

ORD. Nº 24 /
ANT.:
MAT: Envía actualización Plan de Reconstrucción Atacama.

COPIAPÓ, 5 ENE. 2017

DE: INTENDENTE DE LA REGIÓN DE ATACAMA
A : SR. MAHMUD ALEUY PEÑA Y LILLO
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR

Junto con saludar cordialmente, el presente tiene por objeto enviar actualización del Plan de Reconstrucción Atacama.

El carácter de las modificaciones se basa en la reestructuración y optimización del plan, de acuerdo a las necesidades visualizadas tras la catástrofe ocurrida los días 24 y 25 de marzo 2015.

Por tal motivo, se ajustó la cartera, a través de la selección y filtración de iniciativas donde se incorporaron, ajustaron nombres o se desestimaron del Plan original de reconstrucción, a fin de pertinencia, optimizar recursos y esfuerzos en proyectos que contribuyan a la recuperación y desarrollo de la Región.

Lo anterior, para informar al Consejo de Ministros sobre las modificaciones realizadas en Plan de Reconstrucción Atacama.

Saluda atentamente a Us.

MIGUEL VARGAS CORREA
INTENDENTE DE LA REGION DE ATACAMA

MVC/OMC/cca
c.c.
- Jefe División Gobierno Interior
- Jefe URS Atacama.
- SEREMI MINVU Atacama
- Archivo

UNIDAD REGIONAL SUBDERE
REGION DE ATACAMA
FECHA RECEPCION: 9-1-2017
FOLIO Nº: 9

- Ord. 24 05/01/2017, de Intendencia de Atacama dirigido a Subsecretario de Interior.
- Informa de las Modificaciones a la iniciativas del Plan de Reconstrucción de Atacama.
- La Propuesta se basa en la información recopilada de los Directorios de Reconstrucción N° 8 y N° 9

Cartera Definitiva Plan Reconstrucción Atacama

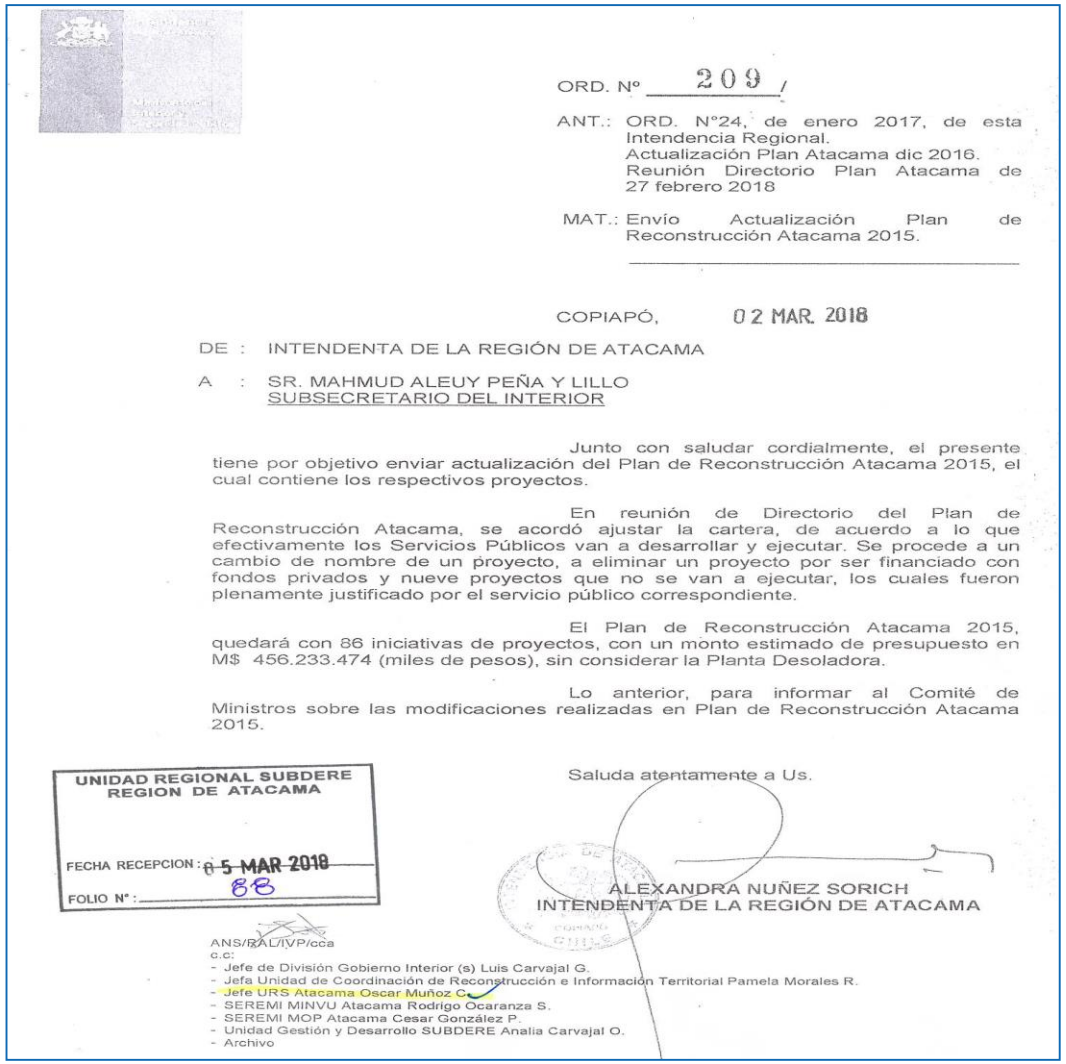

ORD. Nº 209 /

ANT.: ORD. N°24, de enero 2017, de esta Intendencia Regional.
Actualización Plan Atacama dic 2016.
Reunión Directorio Plan Atacama de 27 febrero 2018

MAT.: Envío Actualización Plan de Reconstrucción Atacama 2015.

COPIAPÓ, 02 MAR. 2018

DE : INTENDENTA DE LA REGIÓN DE ATACAMA

A : SR. MAHMUD ALEUY PEÑA Y LILLO
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR

Junto con saludar cordialmente, el presente tiene por objetivo enviar actualización del Plan de Reconstrucción Atacama 2015, el cual contiene los respectivos proyectos.

En reunión de Directorio del Plan de Reconstrucción Atacama, se acordó ajustar la cartera, de acuerdo a lo que efectivamente los Servicios Públicos van a desarrollar y ejecutar. Se procede a un cambio de nombre de un proyecto, a eliminar un proyecto por ser financiado con fondos privados y nueve proyectos que no se van a ejecutar, los cuales fueron plenamente justificado por el servicio público correspondiente.

El Plan de Reconstrucción Atacama 2015, quedará con 86 iniciativas de proyectos, con un monto estimado de presupuesto en M$ 456.233.474 (miles de pesos), sin considerar la Planta Desoladora.

Lo anterior, para informar al Comité de Ministros sobre las modificaciones realizadas en Plan de Reconstrucción Atacama 2015.

UNIDAD REGIONAL SUBDERE
REGION DE ATACAMA
FECHA RECEPCION: 05 MAR 2018
FOLIO N°: 88

Saluda atentamente a Us.

ALEXANDRA NUÑEZ SORICH
INTENDENTA DE LA REGIÓN DE ATACAMA

ANS/RAL/IVP/cca
c.c:
- Jefe de División Gobierno Interior (s) Luis Carvajal G.
- Jefe Unidad de Coordinación de Reconstrucción e Información Territorial Pamela Morales R.
- Jefe URS Atacama Oscar Muñoz C.
- SEREMI MINVU Atacama Rodrigo Ocaranza S.
- SEREMI MOP Atacama Cesar González P.
- Unidad Gestión y Desarrollo SUBDERE Analia Carvajal O.
- Archivo

- Ord. 209 02/03/2018, de Intendencia de Atacama dirigido a Subsecretario de Interior.

- Informa de la Cartera Definitiva para el Plan de Reconstrucción Atacama 2015-2020
  - 86 Iniciativas
  - Monto total M$ 469.509.750

Plan de Reconstrucción Atacama			
PRESUPUESTO	**M$ 469.509.750**	**N° PROYECTOS**	**86**

SERVICIOS PÚBLICOS

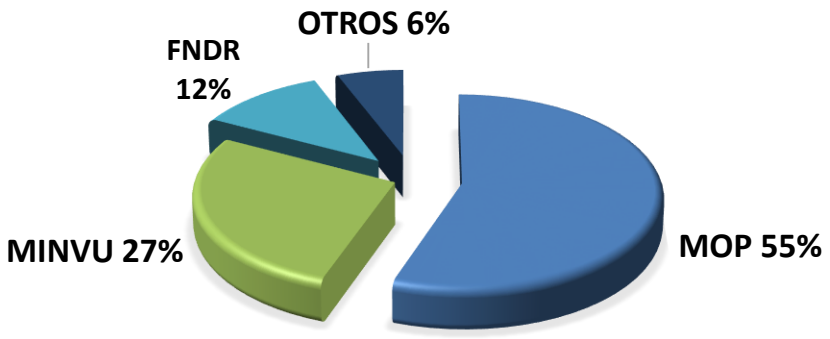

Servicios Públicos	Marco Presupuestario M$
MOP M$	$260.319.409
MINVU M$	$123.758.459
FNDR M$	$57.440.178
OTROS SP M$	$27.991.704
TOTAL M$	**$469.509.750**

Avance Financiero al 31 de Julio 2018

Partida	Presupuesto Actualizado 2018 M$	Gasto Acumulado 2015 - 2016 - 2017 - 2018 en Miles de pesos (M$)	% de ejecución del Presupuesto Actualizado
Agricultura	$ 4.473.000	$ 4.473.000	100%
Economía	$ 2.718.091	$ 2.501.952	92%
Educación	$ 4.874.188	$ 4.874.188	100%
Interior (SUBDERE, FNDR)	$ 64.572.456	$ 34.018.958	53%
Minería	$ 1.218.349	$ 1.218.349	100%
Vivienda y Urbanismo	$ 123.758.459	$ 68.393.529	55%
Obras Públicas	$ 260.319.409	$ 130.532.180	50%
Salud	$ 5.180.579	$ 5.180.579	100%
Deporte	$ 2.395.219	$ 2.395.219	100%
TOTAL	**$ 469.509.750**	$ **253.587.954**	**54,01%**

Avance por Sector Plan de Reconstrucción Atacama 2015-2020

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	
N° PROYECTOS	20
MONTO TOTAL	M$ 260.319.409
GASTO A JULIO/2018	M$ 130.532.180
% DE AVANCE	**50,1 %**

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	
N° PROYECTOS	20
MONTO TOTAL	M$ 123.758.459
GASTO A JULIO/2018	M$ 68.393.529
% DE AVANCE	**55,3 %**

FNDR	
N° PROYECTOS	20
MONTO TOTAL	M$ 57.440.178
GASTO A JULIO/2018	M$ 32.823.787
% DE AVANCE	**57%**

OTROS SERVICIOS PUBLICOS	
N° PROYECTOS	26
MONTO TOTAL	M$ 27.991.704
GASTO A JULIO/2018	M$ 21.838.458
% DE AVANCE	**78%**

Estado Actual de Proyectos

ESTADO DE LOS PROYECTOS ACTUAL		
SITUACION PROYECTOS	**N° PROYECTOS**	**PORCENTAJE**
PROYECTOS TERMINADOS	45	52%
PROYECTOS EN EJECUCIÓN	34	40%
PROYECTOS EN PROCESO	7	8%
TOTAL	**86**	**100%**

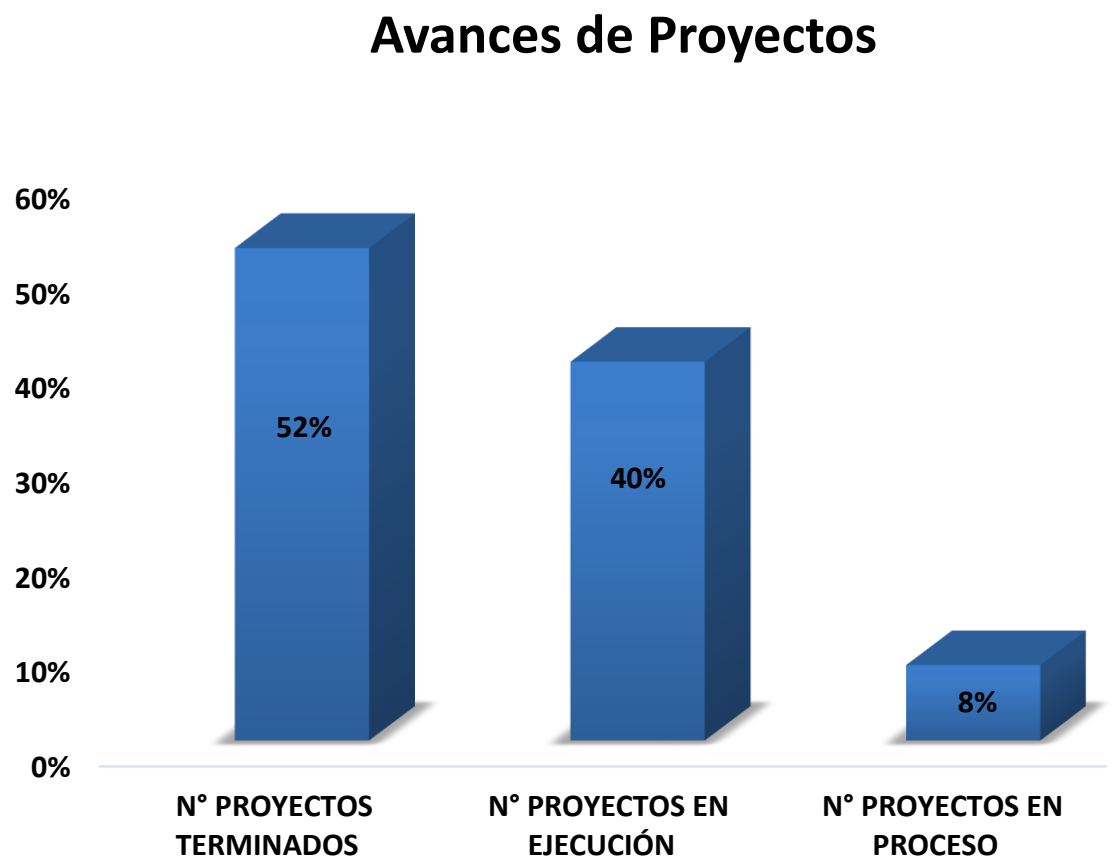

Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

gob.cl

GASTO PLAN DE RECONSTRUCCION MOP

PROYECTOS TERMINADOS

N°	Nombre del Proyecto	Comuna	Estado de Avance	Monto Contrato [M$]	Monto Actual [M$]	Gasto Acumulado	Gasto Total	Fecha Inicio	Fecha Término	Avance Financiero	Avance Físico
1	Conservación Red Vial Región de Atacama - años 2015-2016 Emergencia Reconstrucción	Regional (Chañaral, Copiapó, Huasco, Pan de azúcar, Diego de Almagro y Alto del Carmen)	Term.	$ 104.694.622	$ 104.694.622	$ 104.694.622	$ 104.694.622	08-05-2015	31-12-2016	100%	100%
2	Conservación Global Mixto Caminos Red Vial III Región 2011-2015	Regional (Huasco, Copiapó y Chañaral)	Term.	$ 5.956.381	$ 5.956.381	$ 5.956.381	$ 5.956.381	25-03-2015	31-12-2016	100%	100%
3	Conservación Red Vial Administración Directa III Región Año 2015	Regional (Mejoramiento Ruta 5, Pasada Chañaral)	Term.	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	25-03-2015	31-12-2015	100%	100%
4	Conservación Obras Portuarias menores III Región (Mejoramiento Bordes costeros e infraestructura)	Regional (Chañaral, Pan de Azúcar)	Term.	$ 2.102.619	$ 2.102.619	$ 2.102.619	$ 2.102.619	05-05-2015	26-06-2017	100%	100%
						Total	**$ 114.253.622**				

Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

gob.cl

CONSERVACION CALETA PAN DE AZUCAR PROYECTO TERMINADO MOP

GASTO PLAN DE RECONSTRUCCION MOP PROYECTOS EN EJECUCION Y EN PROCESO

N°	Nombre del Proyecto	Comuna	Estado de Avance	Monto Contrato [M$]	Gasto Acumulado	Avance Financiero	Avance Físico
1	Conservación de Riberas y Cauces Naturales III Región año 2016	Regional	Ejecución	$ 9.025.327	$ 9.025.327	99%	99%
2	Reposición Puente Nicolás Naranjo En Ruta C-495 (Diseño)	Alto Del Carmen	Ejecución	$ 324.415	$ 63.377	20%	20%
	Reposición Puente Nicolás Naranjo En Ruta C-495 (Ejecución)	Alto Del Carmen	proceso	$ 2.500.000	$ -	0%	0%
3	Mejoramiento Ruta 5, s: Pasada por Chañaral (Diseño)	Regional	Ejecución	$ 353.682	$ 222.406	63%	63%
	Mejoramiento Ruta 5, s: Pasada por Chañaral (Ejecución)	Regional	Proceso	$ 8.000.000	$ -	0%	0%
4	Diseño Borde Costero De Chañaral Por Reconstrucción	Regional	Proceso	$ 102.844	$ -	0%	0%
	Construcción Borde Costero De Chañaral Por Reconstrucción (Ejecución)	Regional	Proceso	$ 2.000.000	$ -	0%	0%
5	Diseño O. Fluviales Rio Copiapó y O. control a Qda. Afluentes	Regional	Ejecución	$ 988.643	$ 400.500	41%	56%
6	Diseño Obras Fluviales y manejo de Cauces en Rio Copiapo	Regional	Ejecución	$ 4.917.816	$ 2.508.515	51%	62%
7	Diseño Obras Fluviales y control Aluvional Quebrada Paipote	Regional	Ejecución	$ 732.437	$ 576.875	79%	90%
8	Diseño O. Fluviales y C. Aluvional Río Copiapó Tierra Amarilla	Regional	Ejecución	$ 879.007	$ 373.883	43%	56%
9	Diseño Obras Fluviales y Control Aluvional Río Salado	Regional	Ejecución	$ 845.244	$ 431.456	51%	60%
10	Diseño O. Fluviales y C,A cuenca del Rio Transito	Regional	Ejecución	$ 750.555	$ 385.759	51%	62%
11	Diseño O. Fluviales y C,A cuenca del Rio el Carmen	Regional	Ejecución	$ 639.362	$ 308.789	48%	65%
12	Mejoramiento Puente Diego De Almagro En Ruta C-17	Regional	Ejecución	$ 270.525	$ 41.396	15%	15%
13	Reposición Red Hidrométrica Cuenca Del Río Copiapó	Regional	Ejecución	$ 634.239	$ 552.665	87%	87%
14	Reposición Red Hidrométrica Cuenca Del Río Huasco	Regional	Ejecución	$ 1.861.688	$ 977.790	53%	53%
15	Mejoramiento Varios Puentes - Cuenca Copiapó- Región de Atacama	Regional	Ejecución	$ 1.540.016	$ 108.332	7%	7%
16	Mejoramiento 31 Ch - Puente Paipote	Regional	Proceso	$ 4.500.000	$ -	0%	0%
			Totales	**$ 40.865.800**	**$ 15.977.070**		

DIAGNOSTICO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Diseños M$ 9.753.064

ID	COMUNA	CARTERA ACTUALIZADA	Financiamiento	unidad técnica	Monto Total M$	% Avance Financiero
1216	REGIONAL	Diseño O. Fluviales Rio Copiapó y O. control a Qda. Afluentes	MOP	D O Hidráulica	$ 988.643	41%
1214	REGIONAL	Diseño Obras Fluviales y manejo de Cauces en Rio Copiapó	MOP	D O Hidráulica	$ 4.917.816	51%
1215	REGIONAL	Diseño Obras Fluviales y control Aluvional Quebrada Paipote	MOP	D O Hidráulica	$ 732.437	79%
1231	REGIONAL	Diseño O. Fluviales y C. Aluvional Río Copiapó Tierra Amarilla	MOP	D O Hidráulica	$ 879.007	43%
1184	REGIONAL	Diseño Obras Fluviales y Control Aluvional Río Salado	MOP	D O Hidráulica	$ 845.244	51%
1269	REGIONAL	Diseño O. Fluviales y C,A cuenca del Rio Transito	MOP	D O Hidráulica	$ 750.555	51%
1273	REGIONAL	Diseño O. Fluviales y C,A cuenca del Rio el Carmen	MOP	D O Hidráulica	$ 639.362	48%

Ejecución M$ 105.000.000 (Inicio estimado 00/00/2021)

ID	COMUNA	CARTERA ACTUALIZADA	Financiamiento	unidad técnica	Monto Total M$	% Avance Financiero
1216	REGIONAL	Construcción Obras Fluviales Río Copiapó en Sector Rural y Obras de Control Aluvional en Quebradas Afluentes, Comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.	MOP	D O Hidráulica	$ 16.000.000	0%
1214	REGIONAL	Construcción Obras Fluviales Río Copiapó en Sector Urbano y Manejo de Cauce en Sector Rural, Comuna de Copiapó	MOP	D O Hidráulica	$ 14.000.000	0%
1215	REGIONAL	Construcción de Obras Fluviales y Manejo de Cauce en la quebrada de Paipote	MOP	D O Hidráulica	$ 15.000.000	0%
1231	REGIONAL	Construcción de Obras Fluviales Río Copiapó en Sector Urbano y Obras de Control Aluvional Quebrada Cerrillos, Comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.	MOP	D O Hidráulica	$ 5.000.000	0%
1184	REGIONAL	Construcción de Obras Fluviales y de Control Aluvional en la cuenca del Rio Salado	MOP	D O Hidráulica	$ 32.000.000	0%
1269	REGIONAL	Construcción de Obras Fluviales y Control Aluvional Cuenca del Río El Tránsito, Comuna de Alto del Carmen	MOP	D O Hidráulica	$ 11.500.000	0%
1273	REGIONAL	Construcción de Obras Fluviales y Control Aluvional Cuenca del Río El Alto Carmen y Río Huasco, Comuna de Alto del Carmen	MOP	D O Hidráulica	$ 11.500.000	0%

AVANCES EN CONSERVACIONES 2015-2018

Resumen Conservaciones Cauces y Riberas, relacionadas a los diseños de obras fluviales

Año	Cantidad Conservaciones	Monto Total	% de avance	Estado de Avance
2015	9	$ 6.187.941	100%	Terminadas
2016	9	$ 2.837.387	100%	Terminadas
2017	8	$ 7.209.707	100%	Terminadas
2018	9	$ 2.632.232	Ejecución	Ejecución
Total	**35**	**$ 18.867.267**		

Proyección 2018-2020 en Conservaciones Cauces y Riberas, relacionadas a los diseños de obras fluviales

N°	Nombre del Proyecto	Comuna	Estado de Avance	Monto Contrato [M$]	Monto Actual [M$]	Gasto Acumulado	Estimación 2018	Proyección 2019	Proyección 2020	Gasto Proyectado 2020
1	Conservación de Riberas y Cauces Naturales III Región año 2016	Regional	Ejecución	$ 9.025.328	$ 37.847.267	$ 16.235.035	$ 2.632.232	$ 3.980.000	$ 15.000.000	$ 37.847.267

PROPUESTA GASTO PLAN DE RECONSTRUCCION 2018-2020

Resumen Ministerio de Obras Publicas							
Nombre Iniciativa	**Cantidad**	**Monto Contrato [M$]**	**Monto Actual [M$]**	**Estimación 2018**	**Proyección 2019**	**Proyección 2020**	**Gasto Proyectado 2020**
Ministerio de Obras Publicas	20	$ 155.119.422	$ 183.941.360	$ 7.633.639	$ 5.174.601	$ 33.692.722	$ 183.941.360

El aumento de Proyección en el año 2020 es mas elevado, por incluir las obras de mayor valor para inicio y termino del año 2020, como los son:

1.- Conservaciones cauces y riberas M$15.000.000
2.- Reposición Puente Nicolás Naranjo Alto del Carmen (diseño y ejecución) M$2.761.038
3.- Mejoramiento Ruta 5, pasada por Chañaral (diseño y ejecución) M$8.000.000
4.- Construcción Borde Costero Chañaral M$ 2.000.000
5.- Mejoramiento Varios Puentes (Puente Paipote, entre otros) M$ 5.931.684

GASTO PLAN DE RECONSTRUCCION MINVU

PROYECTOS TERMINADOS

N°	Nombre del Proyecto	Comuna	Estado de Avance	Monto Contrato [M$]	Monto Actual [M$]	Gasto Acumulado	Gasto Total	Fecha Inicio	Fecha Término	Avance Financiero	Avance Físico
1	Actualización Prc Diego De Almagro Y Estudio De Riesgos.	DIEGO DE ALMAGRO	Terminado	$ 130.000	$ 130.000	$ 130.000	$ 130.000	01-09-2015	31-10-2017	100%	100%
2	Adquisición De Terrenos San Félix (1,08 Ha)	ALTO DEL CARMEN	Terminado	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	31-12-2016	28-02-2017	100%	100%
3	Adquisición De Terrenos el transito (1,72 ha _ 2 terrenos)	ALTO DEL CARMEN	Terminado	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	31-12-2016	28-02-2017	100%	100%
						Total	**$ 250.000**				

CASA PILOTO VIVIENDA SAN FELIX PROYECTO TERMINADO MINVU

Gobierno de Chile

gob.cl

CHILE LO HACEMOS TODOS

GASTO PLAN DE RECONSTRUCCION MINVU PROYECTOS EN EJECUCION Y EN PROCESO

N°	Nombre del Proyecto	Comuna	Estado de Avance	Monto Contrato [M$]	Gasto Acumulado	Avance Financiero	Avance Físico
1	Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (fsev- ds 49)	Regional	Ejecución	$ 38.631.327	$ 26.514.385	69%	67%
2	Programa Protección al Patrimonio Familiar	Regional	Ejecución	$ 26.274.163	$ 18.585.650	71%	70%
3	Programa De Adquisición De Viviendas (Ds01)	Regional	Ejecución	$ 7.798.673	$ 8.063.211	103%	102%
4	Actualización Plan Regulador Y Estudio Situación De Riesgos En La Comuna De Chañaral	Chañaral	Ejecución	$ 210.000	$ 142.500	68%	68%
5	Elaboración Plan Regulador Y Estudio Situación De Riesgos Comuna De Tierra Amarilla	Tierra Amarilla	Ejecución	$ 150.000	$ 102.500	68%	55%
6	Actualización Plan Regulador Y Estudio De Riesgos De La Comuna De Copiapó.	Copiapó	Ejecución	$ 210.000	$ 115.500	55%	55%
7	Formulación Pri Huasco Y Estudios De Riesgos (San Félix Y Del Tránsito + Huasco, Freirina Y Vallenar)	Alto del Carmen	Ejecución	$ 130.000	$ 91.000	70%	70%
8	Conservación Y Reposición De Vías Urbanas Y Entorno, Región Atacama	Regional	Ejecución	$ 19.100.000	$ 6.145.206	32%	32%
9	Conservación Y Reparación Parques Kaukari 1, Schneider Y Paipote 2	Copiapó	Ejecución	$ 3.948.000	$ 2.912.603	74%	74%
10	Conservación Y Reposición Eepp Henríquez, Matta, Plazas Atacama	Copiapó	Ejecución	$ 5.668.400	$ 3.779.724	67%	64%
11	Conservación Y Reparación Red De Ciclo vías De Corto Plazo, Copiapó	Copiapó	Ejecución	$ 800.000	$ 488.604	61%	61%
12	Construcción Conexión Inés De Suárez, Paipote, Copiapó (Diseño)	Copiapó	Ejecución	$ 223.353	$ 79.544	36%	50%
	Construcción Conexión Inés De Suárez, Paipote, Copiapó (Ejecución)	Copiapó	Ejecución	$ 3.000.000	$ -	0%	0%
13	Construcción Mitigaciones de Amenazas Las Bandurrias, Copiapó (Diseño)	Copiapó	Proceso	$ 320.000	$ 1.000	0%	0%
	Construcción Mitigaciones de Amenazas Las Bandurrias, Copiapó (Ejecución)	Copiapó	Proceso	$ 6.000.000	$ -	0%	0%
	Construcción Mitigaciones de Amenazas Las Bandurrias, Copiapó (Expropiación)	Copiapó	Proceso	$ 2.800.000	$ -	0%	0%

GASTO PLAN DE RECONSTRUCCION MINVU PROYECTOS EN EJECUCION Y EN PROCESO

N°	Nombre del Proyecto	Comuna	Estado de Avance	Monto Contrato [M$]	Gasto Acumulado	Avance Financiero	Avance Físico
14	Construcción Barrio Comercial Costero Merino Jarpa, Chañaral (Diseño)	Chañaral	Proceso	$ 250.000	$ -	0%	0%
	Construcción Barrio Comercial Costero Merino Jarpa, Chañaral (Ejecución)	Chañaral	Proceso	$ 2.600.000	$ -	0%	0%
15	Diseño Proyecto Urbanización Campamento Cardenal Raúl Silva Henríquez y Consolidación Área Recreacional de Borde, Tierra Amarilla	Tierra Amarilla	Proceso	$ 130.000	$ -	0%	0%
	Construcción Parque Sector Cardenal Silva Henríquez, Los Loros. (ejecución)	Tierra Amarilla	Proceso	$ 1.500.000	$ -	0%	0%
16	Construcción Sitios De Resguardo Miradores Alto Del Carmen (Diseño)	Alto del Carmen	Ejecución	$ 94.543	$ 37.430	40%	41%
	Construccion Sitios De Resguardo Miradores Alto Del Carmen (Ejecución)	Alto del Carmen	Ejecución	$ 2.000.000	$ -	0%	41%
17	Construcción Macro urbanización Sector 26 De Octubre, Etapa 1, Chañaral	Chañaral	Ejecución	$ 1.670.000	$ 1.084.672	65%	99%
			Total	**$ 136.287.058**	**$ 68.143.529**		

AVANCES PARQUES Y EEPP 2018-2020

Cuadro Resumen Parques							
Nombre Iniciativa	**Monto Contrato [M$]**	**Monto Actual [M$]**	**Gasto Acumulado**	**Estimación 2018**	**Proyección 2019**	**Proyección 2020**	**Gasto Proyectado 2020**
Conservación y Reparación Parques Kaukari 1, Shneider y Paipote 2 (Ejecución)	$ 3.948.000	$ 4.542.943	$ 2.912.603	$ 481.072	$ 695.832	$ 453.436	$ 4.542.943

Cuadro Resumen EEPP Plazas							
Nombre Iniciativa	**Monto Contrato [M$]**	**Monto Actual [M$]**	**Gasto Acumulado**	**Estimación 2018**	**Proyección 2019**	**Proyección 2020**	**Gasto Proyectado 2020**
Conservación y Reposición EEPP Henríquez, Matta, Plazas Atacama	$ .908.161	$ 6.662.561	$ 3.779.724	$ 1.226.771	$ 913.031	$ 743.035	$ 6.662.561

AVANCES VIAS Y CICLOVIAS 2018-2020

Cuadro Resumen Vías

Nombre Iniciativa	Monto Contrato [M$]	Monto Actual [M$]	Gasto Acumulado	Estimación 2018	Proyección 2019	Proyección 2020	Gasto Proyectado 2020
Conservación y Reposición de Vías Urbanas y entorno	$ 19.100.000	$ 7.968.141	$ 6.145.206	$ 1.758.285	$ 2.900.000	$ 2.900.000	$ 13.703.491

Cuadro Resumen Ciclo vías

Nombre Iniciativa	Monto Contrato [M$]	Monto Actual [M$]	Gasto Acumulado	Estimación 2018	Proyección 2019	Proyección 2020	Gasto Proyectado 2020
Conservación y Reparación red de Ciclo vías de corto plazo, Copiapó (Ejecución)	$ 800.000	$ 896.813	$ 488.604	$ 408.209	$ -	$ -	$ 896.813

PROPUESTA GASTO PLAN DE RECONSTRUCCION MINVU 2018-2020

Nombre Iniciativa	Cantidad	Monto Contrato [M$]	Monto Actual [M$]	Gasto Acumulado	Estimación 2018	Proyección 2019	Proyección 2020	Gasto Proyectado 2020	Montos pendientes por pagar 2021-2023
Proyectos varios	17	$ 94.638.185	$ 97.849.113	$ 56.296.518	$ 6.469.335	$ 5.621.804	$ 7.815.787	$ 76.203.444	$ 21.645.669
Conservación y Reparación red de Ciclo vías de corto plazo, Copiapó (Ejecución)	4	$ 800.000	$ 896.813	$ 488.604	$ 408.209	$ -	$ -	$ 896.813	$ -
Conservación y Reposición de Vías Urbanas y entorno	26	$ 19.100.000	$ 13.703.491	$ 6.145.206	$ 1.758.285	$ 2.900.000	$ 2.900.000	$ 13.703.491	$ -
Conservación y Reposición EEPP Henríquez, Matta, Plazas Atacama	31	$ 5.668.400	$ 6.662.561	$ 3.779.724	$ 1.226.771	$ 913.031	$ 743.035	$ 6.662.561	$ -
Conservación y Reparación Parques Kaukari 1, Schneider y Paipote 2 (Ejecución)	12	$ 3.948.000	$ 4.542.943	$ 2.912.603	$ 481.072	$ 695.832	$ 453.436	$ 4.542.943	$ -
Totales	**90**	**$ 124.154.585**	**$ 123.654.921**	**$ 69.622.655**	**$ 10.343.672**	**$ 10.130.667**	**$ 11.912.258**	**$ 102.009.252**	**$ 21.645.669**

PROPUESTA NUEVOS PROYECTOS MINVU PLAN DE RECONSTRUCCION 2018-2020

N°	Nombre del Proyecto	Comuna	Monto Contrato [M$]	Monto Actual [M$]	Gasto Acumulado	Estimación 2018	Proyección 2019	Proyección 2020	Gasto Proyectado 2020	Fecha Inicio	Fecha Término	Avance Financiero	Avance Físico
1	Construcción Macro urbanización Sector 26 de Octubre, Etapa II Chañaral (Ejecución)	Chañaral	$ 300.000	$ 2.694.193	$ -	$ 132.206	$ 1.231.200	$ 1.330.787	$ 2.694.193	10-07-2019	dic-20	0,0%	0%
2	Construcción espacios Públicos Ribereño Sector Ojanco, Tierra Amarilla (Diseño)	Tierra Amarilla	$ 136.500	$ 136.500	$ -	$ 26.040	$ 110.460	$ -	$ 136.500	jul-05	31-12-2019	0,0%	0%
	Construcción espacios Públicos Ribereño Sector Ojanco, Tierra Amarilla (Ejecución)	Tierra Amarilla	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ -	$ -	$ -	$ 440.000	$ 440.000	01--01-2020	31-12-2020	0,0%	0%
3	Adquisición terreno en comuna de Tierra Amarilla (* En toma razón Contraloría)	Tierra Amarilla	$ 1.229.626	$ 1.229.626	$ 1.229.626	$ -	$ -	$ -	$ 1.229.626			0,0%	100%
		Totales	**$ 3.866.126**	**$ 6.260.319**	**$ 1.229.626**	**$ 158.246**	**$ 1.341.660**	**$ 1.770.787**	**$ 4.500.319**				

PROYECTO PARA REEVALUAR

Proyecto para reevaluar			
Nombre Iniciativa	**Monto Contrato [M$]**	**Monto Actual [M$]**	**Gasto Acumulado**
Construcción Barrio Comercial Costero Merino Jarpa, Chañaral (Diseño y Ejecución)	$ 2.850.000	$ 2.850.000	$ -

Este proyecto no tiene factibilidad de ejecución antes del año 2020, ya que esta asociado a los estudios de diseños del Ministerio de Obras Publicas que tienen finalización el año 2019.

Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

gob.cl

GASTO PLAN DE RECONSTRUCCION FNDR

PROYECTOS TERMINADOS

N°	Nombre del Proyecto	Comuna	Estado de Avance	Monto Contrato [M$]	Gasto Acumulado	Avance Financiero	Avance Físico
1	Reposición Subcomisaria Carabineros Diego De Almagro	DIEGO DE ALMAGRO	Terminado	$ 1.156.956	$ 1.177.966	100%	100%
2	Construcción Tranque Retenedor De Aguas Lluvias En Los Loros, Tierra Amarilla	TIERRA AMARILLA	Terminado	$ 204.570	$ 204.570	100%	100%
3	Reposición De Pavimentos Av. Diego De Almagro, Diego De Almagro	DIEGO DE ALMAGRO	Terminado	$ 704.872	$ 704.872	100%	100%
4	Reposición De Pavimentos Av. Juan Martínez, Diego De Almagro	DIEGO DE ALMAGRO	Terminado	$ 1.002.020	$ 1.002.020	100%	100%
5	Reposición De Pavimentos Calle J.A. Ríos T R. De Quiroga D. Almagro	DIEGO DE ALMAGRO	Terminado	$ 385.881	$ 385.881	100%	100%
6	Reposición Y Adq. Equipamiento Mayor Bomberos De R. De Atacama	DIEGO DE ALMAGRO	Terminado	$ 2.481.729	$ 2.481.729	100%	100%
7	Reposición Cuartel Policial Chañaral	CHAÑARAL	Terminado	$ 566.617	$ 566.617	100%	100%
8	Transferencia Programa Especial De Emergencia Productiva De Atacama	REGIONAL	Terminado	$ 1.503.922	$ 1.503.922	100%	100%
9	Fortalecimiento En La Innovación Y El Emprendimiento De Las Mipes De Atacama-Barríos Comerciales	REGIONAL	Terminado	$ 49.565	$ 49.565	100%	100%
10	Programa Transferencia mejoramiento operación de micro y pequeños empresarios del transporte público de pasajeros y escolar región de Atacama	REGIONAL	Terminado	$ 928.597	$ 928.597	100%	100%
11	Transferencia Asistencia Emergencia Pequeña Mineria Y Artesanal De La Región	REGIONAL	Terminado	$ 1.129.621	$ 1.129.621	100%	100%
12	Reposición CESFAM Chañaral	CHAÑARAL	Terminado	$ 3.358.652	$ 3.358.652	100%	100%
			TOTAL	**$ 13.473.002**	**$ 13.473.002**		

GASTO PLAN DE RECONSTRUCCION FNDR

PROYECTOS EN EJECUCION Y EN PROCESO

N°	Nombre del Proyecto	Comuna	Estado de Avance	Monto Contrato [M$]	Gasto Acumulado	Avance Financiero	Avance Físico
1	Reposición De Veredas Y Obras Complementarias Sector Centro Copiapó	COPIAPÓ	Ejecución	$ 3.231.109	$ 3.240.272	99%	99%
2	Conservación De Calles Y Vias Copiapó	COPIAPÓ	Ejecución	$ 10.638.105	$ 6.613.451	62%	62%
3	Conservación Caminos Básicos 2016-2018-Prov. Chañaral	CHAÑARAL	Ejecución	$ 2.934.956	$ 2.472.478	84%	84%
4	Conservación Caminos Basicos 2016-2018-Prov. Copiapó	COPIAPÓ	Ejecución	$ 13.252.865	$ 4.183.348	32%	32%
5	Reposición Edificio Consistorial, Tierra Amarilla	TIERRA AMARILLA	Proceso	$ 5.760.000	$ -	0%	0%
6	Reposición infraestructura de semáforos Copiapó	COPIAPÓ	Proceso	$ 2.478.766	$ -	0%	0%
7	Transferencia Para La Inversión Y Fomento De Riego Y Drenaje	REGIONAL	Ejecución	$ 4.500.000	$ 2.843.756	63%	63%
8	Fortalecimiento En La Innovación Y El Emprendimiento De Las Mipes De Atacama-Programa Crece Sercotec	REGIONAL	Ejecución	$ 1.171.375	$ 506.660	27%	27%
			TOTAL	**$ 43.967.176**	**$ 19.859.965**		

CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA C-440 SECTOR CANTO DEL AGUA PROVINCIA HUASCO 2018-2019

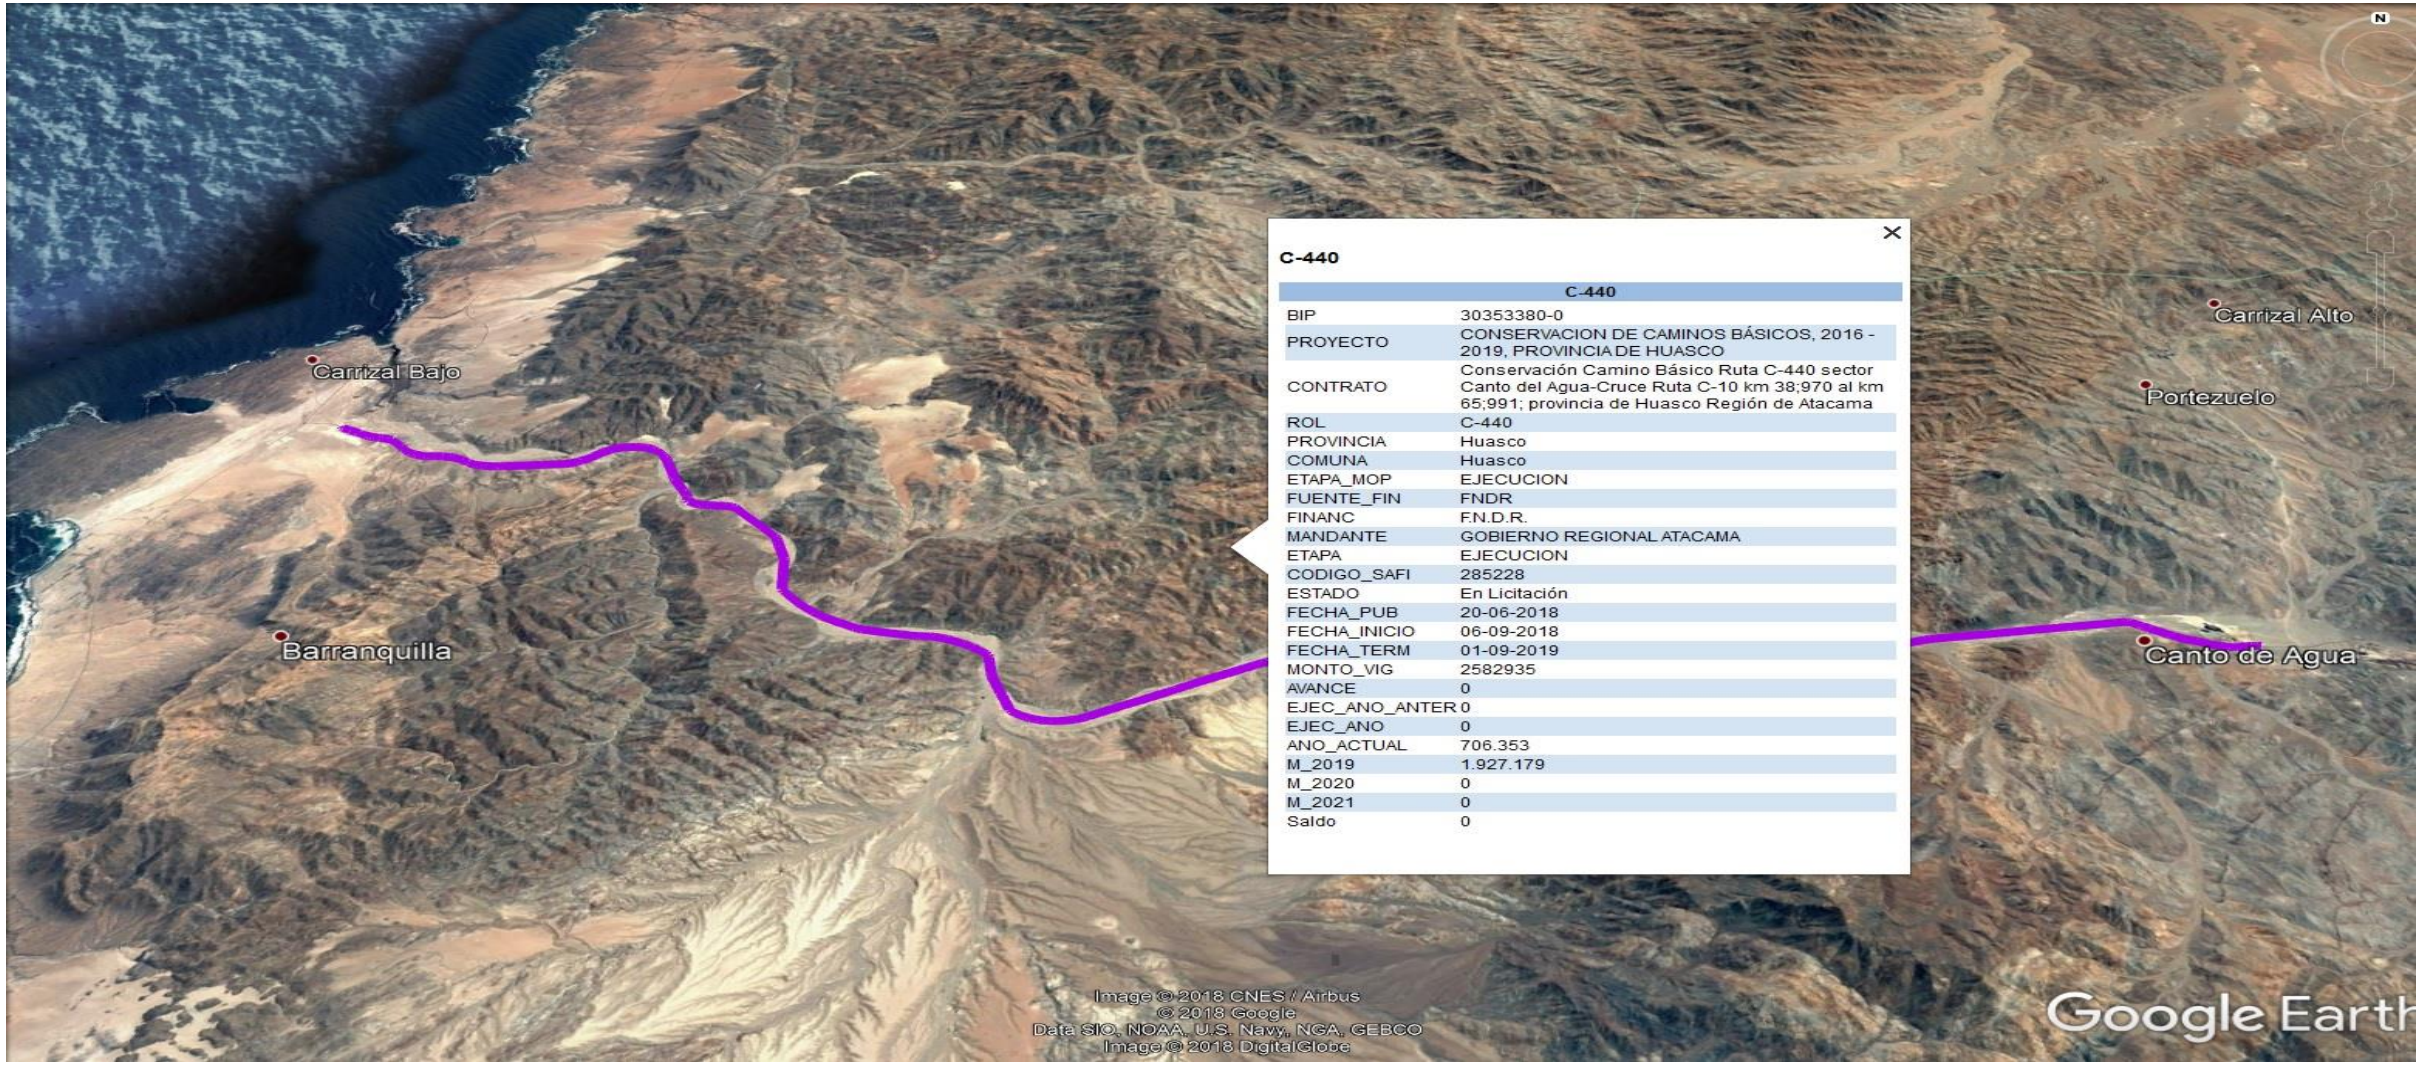

C-440

C-440	
BIP	30353380-0
PROYECTO	CONSERVACION DE CAMINOS BÁSICOS, 2016 - 2019, PROVINCIA DE HUASCO
CONTRATO	Conservación Camino Básico Ruta C-440 sector Canto del Agua-Cruce Ruta C-10 km 38;970 al km 65;991; provincia de Huasco Región de Atacama
ROL	C-440
PROVINCIA	Huasco
COMUNA	Huasco
ETAPA_MOP	EJECUCION
FUENTE_FIN	FNDR
FINANC	F.N.D.R.
MANDANTE	GOBIERNO REGIONAL ATACAMA
ETAPA	EJECUCION
CODIGO_SAFI	285228
ESTADO	En Licitación
FECHA_PUB	20-06-2018
FECHA_INICIO	06-09-2018
FECHA_TERM	01-09-2019
MONTO_VIG	2582935
AVANCE	0
EJEC_ANO_ANTER	0
EJEC_ANO	0
ANO_ACTUAL	706.353
M_2019	1.927.179
M_2020	0
M_2021	0
Saldo	0

CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA C-351 SECTOR CALDERA – NEGRO PASTENE PROVINCIA COPIAPO 2018-2019

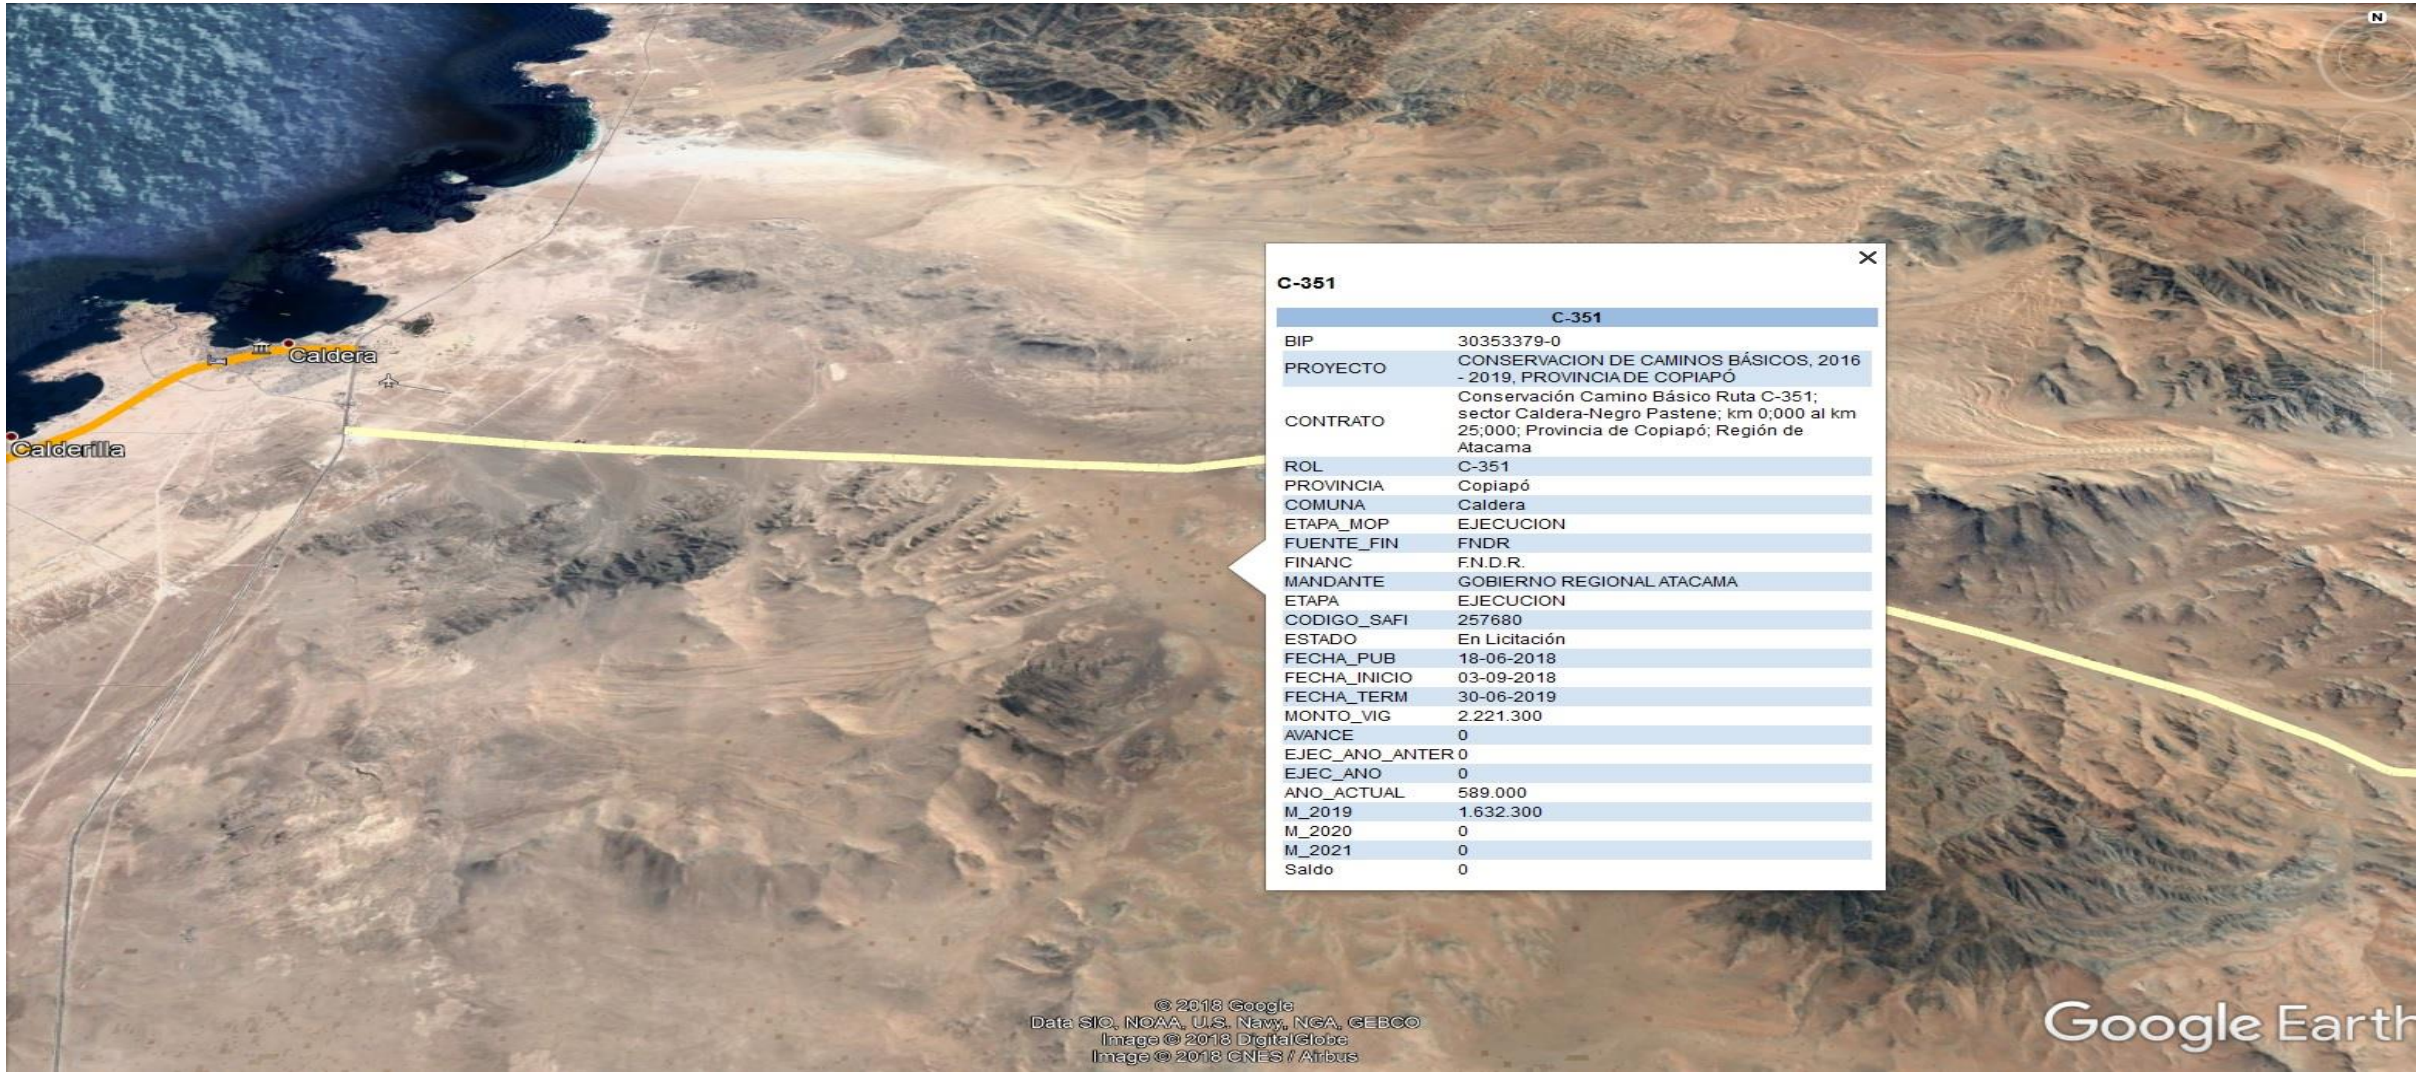

GASTO PLAN DE RECONSTRUCCION OTROS SERVICIOS

OTROS SERVICIOS	
Proyectos Terminados	25
Proyectos Ejecución (Programa de Pesca Artesanal, Sernapesca, Economía con 27% avance)	1
Total	**26**

Conservación Infraestructura Hospital Regional Copiapó

Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

gob.cl

PROYECCION DE GASTO PLAN DE RECONSTRUCCION 2018-2020

Partida	Presupuesto Actualizado 2018 M$	Gasto Acumulado 2015 - 2016 - 2017 - 2018 en Miles de pesos (M$)	Gasto proyectado 2018	Gasto proyectado 2019	Gasto proyectado 2020	Total Proyección	% de ejecución del Presupuesto Actualizado
Agricultura	$ 4.473.000	$ 4.473.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.473.000	100%
Economía	$ 2.718.091	$ 2.501.952	$ -	$ -	$ -	$ 2.501.952	92%
Educación	$ 4.874.188	$ 4.874.188	$ -	$ -	$ -	$ 4.874.188	100%
Interior (SUBDERE, FNDR)	$ 64.572.456	$ 34.018.958	$ 2.146.649	$ 21.373.587	$ 7.062.383	$ 64.601.577	100%
Minería	$ 1.218.349	$ 1.218.349	$ -	$ -	$ -	$ 1.218.349	100%
Vivienda y Urbanismo	$ 123.654.921	$ 69.622.655	$ 10.343.672	$ 10.130.667	$ 11.912.258	$ 102.009.252	82%
Obras Públicas	$ 183.941.360	$ 137.440.398	$ 7.633.639	$ 5.174.601	$ 33.692.722	$ 183.941.360	100%
Salud	$ 5.180.579	$ 5.180.579	$ -	$ -	$ -	$ 5.180.579	100%
Deporte	$ 2.395.219	$ 2.395.219	$ -	$ -	$ -	$ 2.395.219	100%
TOTAL	**$ 393.028.163**	**$ 261.725.298**	**$ 20.123.960**	**$ 36.678.855**	**$ 52.667.363**	**$ 371.195.476**	**95%**

GOBIERNO REGIONAL

REGIÓN DE ATACAMA
